

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Fecha de Inicio y Término			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
Control	Sector	Programa	Subprograma	Proyecto	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Reg. In. Real	Reg. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55285/ 0001 30484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION D EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR2432Z EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-29	1,182,531.00	1,182,531.00	0.00	1,180,774.76	1,180,774.76	0.00	02 METRO CUADRO	447.87		5 ALUMNO	280	280	99	99.85
55314/ 0002 1027	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	2022-04-20	2022-07-07	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30		3 POBLADO	1	200	100	100.00
55321/ 0003 29935	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CALLE OLGA NAVARRO LEGORRETA BARRIO SANTO DOMINGO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CIUDAD DE JOCOTITLAN ASENTAMIENTO SANTO DOMINGO / JOCOTITLAN	CONTRATO	2022-05-02	2022-06-02	439,831.65	439,831.65	0.00	355,062.93	355,062.93	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	36	81	80.73
55326/ 0004 63400	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / RUSO, EL	CONTRATO	2022-06-06	2022-07-05	463,189.08	463,189.08	0.00	384,585.45	384,585.45	0.00	17 PIEZA	1.00		4 MUNICIPIO	1	52	83	83.03
55327/ 0005 29100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T. 15DPR1398D EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2022-04-25	2022-07-08	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	1,153,267.48	1,153,267.48	0.00	02 METRO CUADRO	73.00		5 ALUMNO	1	120	80	79.53
55334/ 0006 61052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1398R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2022-05-23	2022-07-30	1,184,476.63	1,184,476.63	0.00	1,182,754.87	1,182,754.87	0.00	02 METRO CUADRO	493.00		5 ALUMNO	1	240	99	99.85
55343/ 0007 60797	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	151 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA ERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTA MARÍA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARÍA CITENDEJE / SANTA MARÍA CITENDEJE	CONTRATO	2022-04-07	2022-06-05	285,767.16	285,767.16	0.00	262,402.90	262,402.90	0.00	17 PIEZA	2.00		3 POBLADO	1	60	92	91.62
55346/ 0008 33640	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO ENGASEME EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATO	2022-05-16	2022-06-30	442,487.80	442,487.80	0.00	413,228.48	413,228.48	0.00	17 PIEZA	7.00		3 POBLADO	1	60	93	93.39

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
13 OCT 2022
RECIBIDO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,786.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Ejec. Fin. Pro.		Ejec. Ter. Pro.			Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avance	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indicador	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Ejec. Fin. Real	Ejec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	R. B.	R. H.	
55353/ 0009 60954	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE / BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,959.07	427,959.07	0.00	17 PIEZA	6.00		3 POBLADO	1	65	92	92.03	
65690/ 0010 58901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CCT. 16EPR1567A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	02 METRO CUADRO	452.40		5 ALUMNO	1	180	99	100.00	
55718/ 0012 1284	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRO	950.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00	
55729/ 0013 26928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRO	670.00		3 POBLADO	1	180	100	100.00	
55732/ 0014 26930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	260,660.61	260,660.61	0.00	260,660.61	260,660.61	0.00	01 METRO LINEAL	146.00		3 POBLADO	1	170	100	100.00	
55737/ 0016 32845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRO	1,107.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00	
55740/ 0017 21764	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	269 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	40		95.60	
55743/ 0018 21765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 16 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 16 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	54,934.58	54,934.58	0.00	02 METRO CUADRO	837.00		3 POBLADO	1	50	28	27.94	
55744/ 0019 21789	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	276,641.16	276,641.16	0.00	276,641.16	276,641.16	0.00	02 METRO CUADRO	740.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00	

EDOMEX
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE NORMATIVIDAD
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 OCT 2022
RECIBIDO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances							
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Reg. Inic. Pro.	Reg. Fin. Pro.	Total	Red. del Fondo	Ingresos E.	Total	R. del Fondo	Ingresos E.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Persona	Hts.	Flr.
55746/ 0020 21778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.80	196,329.80	0.00	196,329.80	196,329.80	0.00	02 METRO CUADRADO	546.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55748/ 0021 21778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE PARAJE EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-05-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	53,789.95	0.00	02 METRO CUADRADO	138.00		3 POBLADO	1	120	100	100.00
55754/ 0022 33682	16 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-19	2022-06-06	149,190.00	149,190.00	0.00	135,248.77	135,248.77	0.00	01 METRO LINEAL	1,440.00		3 POBLADO	1	103	81	90.85
55761/ 0024 32679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-07-30	211,970.12	211,970.12	0.00	211,970.12	211,970.12	0.00	01 METRO LINEAL	400.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55764/ 0025 91086	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJESANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-08-19	82,810.00	82,810.00	0.00	81,403.03	81,403.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00		3 POBLADO	1	90	88	98.30
55783/ 0026 91637	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-08-31	183,580.00	183,580.00	0.00	180,302.52	180,302.52	0.00	02 METRO CUADRADO	394.40		3 POBLADO	1	150	98	98.21
55797/ 0027 26931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELLY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-08-31	955,403.59	955,403.59	0.00	955,403.59	955,403.59	0.00	02 METRO CUADRADO	1,893.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55799/ 0028 26938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-11	202,214.60	202,214.60	0.00	202,214.60	202,214.60	0.00	02 METRO CUADRADO	525.00		3 POBLADO	1	54	80	100.00
55801/ 0029 21777	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2022-04-26	2022-06-24	187,024.83	187,024.83	0.00	187,024.83	187,024.83	0.00	02 METRO CUADRADO	400.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00

RECIBO
13 Oct 2022
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Contro	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y Acción		Mod. Elec.	Ej. Fin. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
				Indicador	Obra/Localidad		Fea. In. Real	Fea. Ter. Real	Total	F. del Fondo	Interases B.	Total	F. del Fondo	Interases B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
55804/003021770	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-04	172,442.23	172,442.23	0.00	172,442.23	172,442.23	0.00	02 METRO CUADRADO	384.00		3 POBLADO	1	38	100	100.00
55806/003130188	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2022-05-24	2022-07-25	286,520.00	286,520.00	0.00	247,033.94	247,033.94	0.00	02 METRO CUADRADO	800.00		3 POBLADO	1	80	83	83.31
55807/003230480	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	212,850.00	0.00	211,474.80	211,474.80	0.00	02 METRO CUADRADO	455.00		3 POBLADO	1	150	89	99.36
55824/003322486	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-22	204,957.07	204,957.07	0.00	204,957.07	204,957.07	0.00	01 METRO LINEAL	84.00		3 POBLADO	1	75	100	100.00
55828/003432407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-05-09	2022-06-10	187,019.84	187,019.84	0.00	187,019.84	187,019.84	0.00	02 METRO CUADRADO	372.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
55832/003521779	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	220,409.80	220,409.80	0.00	220,409.80	220,409.80	0.00	02 METRO CUADRADO	570.00		3 POBLADO	1	420	100	100.00
55833/003630479	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	180,000.00	0.00	176,211.85	176,211.85	0.00	02 METRO CUADRADO	390.00		3 POBLADO	1	120	188	97.90
55834/003721787	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-06-17	2022-06-20	153,252.37	153,252.37	0.00	153,252.37	153,252.37	0.00	02 METRO CUADRADO	316.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
55835/003833688	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-08-10	479,856.88	479,856.88	0.00	479,856.88	479,856.88	0.00	02 METRO CUADRADO	931.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
55837/003921788	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2022-05-23	2022-08-30	389,048.40	389,048.40	0.00	389,048.40	389,048.40	0.00	02 METRO CUADRADO	633.00		3 POBLADO	1	124	100	100.00

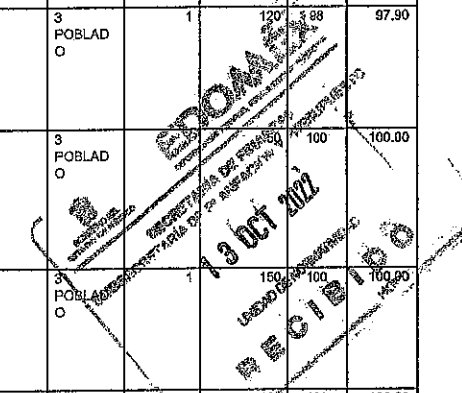

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra/Acción						Ejercicio		Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indice	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Feb. Int. Real	Feb. Ter. Real	Total	R. de Fondo	Intereses E.	Total	R. de Fondo	Intereses E.	U. Medida	Aprobada	Avanzada	U. Medida	Capacidad	U. Personas	IS	Fin.
55838/004021772	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	325,236.84	325,236.84	0.00	325,236.84	325,236.84	0.00	02 METRO CUADRA	707.00		3 POBLADO	1	57	100	100.00
55839/0041101311	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CHIVORO ASENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	185,890.00	185,890.00	0.00	184,177.92	184,177.92	0.00	02 METRO CUADRA	420.00		3 POBLADO	1	120	100	99.07
55849/004232786	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL FRESNO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2022-06-16	2022-07-30	414,384.36	414,384.36	0.00	414,384.36	414,384.36	0.00	02 METRO CUADRA	982.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
56105/004333100	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	131,557.85	131,557.85	0.00	131,557.85	131,557.85	0.00	02 METRO CUADRA	238.00		3 POBLADO	1	220	100	100.00
56107/004435091	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	254,084.75	254,084.75	0.00	254,084.75	254,084.75	0.00	02 METRO CUADRA	580.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
56112/004568615	16 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI ASENTAMIENTO SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,095,454.98	1,095,454.98	0.00	981,922.52	981,922.52	0.00	50 EQUIPO	1.00		3 POBLADO	1	520	80	89.64
56115/004690973	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,880.00	101,880.00	0.00	99,693.50	99,693.50	0.00	02 METRO CUADRA	279.00		3 POBLADO	1	88	100	97.85
56117/004761000	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE ASENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-06-20	529,083.13	529,083.13	0.00	529,083.13	529,083.13	0.00	01 METRO LINEAL	594.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
56803/004821766	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-30	185,400.00	185,400.00	0.00	123,803.29	123,803.29	0.00	02 METRO CUADRA	428.00		3 POBLADO	1	50	67	66.78

EXCOORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA
13 OCT 2022
REVISADO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercido Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Reg. Int. Pro.	Ed. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Monto Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. In. Real	Ed. Ter. Real	Total	Pr. del Fondo	Intereses B.	Total	Ru. del Fondo	Intereses B.	U. Medida Aprobada	U. Medida Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Plaz.	Fin.
56878/004921773	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2022-07-18	2022-09-30	223,710.00	223,710.00	0.00	56,162.96	56,162.96	0.00	01 METRO LINEAL	333.00	3 POBLADO	1	100	25	25.11
56887/005026934	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE JUAN ALLENDE-COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2022-07-08	2022-08-31	523,678.50	523,678.50	0.00	323,883.81	323,883.81	0.00	02 METRO CUADRADO	975.00	3 POBLADO	1	165	61	61.86
56889/005126936	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-24	196,250.00	196,250.00	0.00	171,039.82	171,039.82	0.00	02 METRO CUADRADO	582.00	3 POBLADO	1	80	87	87.16
56956/0052119231	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARA LA LOMITA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-06-08	2022-07-08	194,700.00	194,700.00	0.00	193,319.80	193,319.80	0.00	02 METRO CUADRADO	420.00	3 POBLADO	1	100	99	99.29
56981/0053119250	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE CONAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2022-06-08	2022-07-08	161,584.84	161,584.84	0.00	161,584.84	161,584.84	0.00	02 METRO CUADRADO	240.00	3 POBLADO	1	80	100	100.00
56995/0054119277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2022-07-02	2022-08-31	201,675.65	201,675.65	0.00	201,675.65	201,675.65	0.00	01 METRO LINEAL	170.00	3 POBLADO	1	80	100	100.00
57003/0055119302	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	112,725.00	112,725.00	0.00	92,743.31	92,743.31	0.00	02 METRO CUADRADO	180.00	3 POBLADO	1	80	80	82.28
57006/0056119310	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINISTRACION	2022-07-05	2022-08-19	111,050.00	111,050.00	0.00	104,563.72	104,563.72	0.00	02 METRO CUADRADO	223.00	3 POBLADO	1	50	50	94.16
57007/0057121479	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-07-09	2022-09-11	570,210.00	570,210.00	0.00	471,729.09	471,729.09	0.00	02 METRO CUADRADO	1,307.60	3 POBLADO	1	120	62	62.75

RECIBIDO
 13 OCT 2022
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE NORMATIVIDAD
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMATICA



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Fisicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022, AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Obra/Localidad	Modalidad	Fed. Inv. Pro.	Fed. Inv. Pro.	Fed. Inv. Pro.	Inversión Autorizada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances			
										Total	3- del Fondo	Intereses B.	Total	3- del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Apr. Obra	Apr. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	FS
57018/ 0058 121614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	111,975.00	111,975.00	0.00	100,006.91	100,006.91	0.00	01 METRO LINEAL	600.00		3 POBLADO	1	100	89	89.31
57021/ 0059 131768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	082 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 15EBH0016P EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-16	2022-09-07	95,624.83	95,624.83	0.00	95,624.83	95,624.83	0.00	02 METRO CUADRADO	146.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00
57023/ 0050 131903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-25	2022-09-30	268,784.94	268,784.94	0.00	268,784.94	268,784.94	0.00	02 METRO CUADRADO	600.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57550/ 0061 21781	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA / PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-29	89,454.35	89,454.35	0.00	89,454.35	89,454.35	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	150	100	100.00
57567/ 0062 21782	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUOMETLA ASENTAMIENTO HUOMETLA / HUOMETLA	ADMINISTRACION	2022-04-23	2022-05-20	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57613/ 0063 29097	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-05-31	111,202.00	111,202.00	0.00	111,202.00	111,202.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	200	100	100.00
57620/ 0064 29098	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHÉ ASENTAMIENTO LAS FUENTES YECHÉ / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00		3 POBLADO	1	100	100	100.00
57634/ 0085 33527	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EJN3351M EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE ASENTAMIENTO LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLEJE	CONTRATO	2022-05-28	2022-08-30	486,892.00	486,892.00	0.00	458,552.59	458,552.59	0.00	01 METRO LINEAL	23.86		3 POBLADO	1	60	50	84.18
57641/ 0068 35647	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	CONTRATO	2022-05-12	2022-06-30	479,946.91	479,946.91	0.00	410,318.71	410,318.71	0.00	17 PIEZA	4.00		3 POBLADO	1	85	85	85.48

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
 TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO
 TEL: (01722) 6250452
 TEL: (01722) 6250459

13 Oct 2022

SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances				
Control	Sector	Programa	Subprograma	Instituto	Obra/Localidad	Módulo	Fec. In. Pro.	Fec. Te. Pro.	Total	F. de Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fís.	Fin.
57678/0067 119262	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA NACIONAL EN JOCOTITLÁN, BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2022-06-23	2022-07-25	119,764.00	119,764.00	0.00	102,257.47	102,257.47	0.00	01 METRO LINEAL	420.00		3 POBLADO	1	103	85	85.39
57681/0068 158792	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	281 CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD MAVORO ASENTAMIENTO MAVORO / MAVORO	CONTRATO	2022-08-11	2022-09-11	275,000.00	275,000.00	0.00	265,704.46	265,704.46	0.00	02 METRO CUADRADO	110.20		3 POBLADO	1	35	97	96.62
57684/0069 169387	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JACINTO ASENTAMIENTO SAN JACINTO / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-10-22	198,975.00	198,975.00	0.00	127,403.28	127,403.28	0.00	02 METRO CUADRADO	456.00		3 POBLADO	1	32	64	64.03
57686/0070 169513	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-08-10	2022-10-07	288,969.73	288,969.73	0.00	288,969.73	288,969.73	0.00	02 METRO CUADRADO	650.00		3 POBLADO	1	80	100	100.00
58377/0071 21771	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARCELONA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE SAN JOAQUÍN ASENTAMIENTO SAN JOAQUÍN / BARRIO SAN JOAQUÍN	ADMINISTRACION	2022-07-11	2022-08-20	243,493.10	243,493.10	0.00	147,499.80	147,499.80	0.00	01 METRO LINEAL	135.00		3 POBLADO	1	85	81	60.58
58378/0072 21776	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 92 RAMON LOPEZ VELARDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO YECHÉ ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHÉ / SANTIAGO YECHÉ	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-30	75,040.00	75,040.00	0.00	19,574.98	19,574.98	0.00	01 METRO LINEAL	120.00		3 POBLADO	1	150	25	26.09
58380/0073 26932	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE EL ROBLE EN BARRIO SANTA CRUZ GRANDE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-30	405,255.00	405,255.00	0.00	43,209.95	43,209.95	0.00	02 METRO CUADRADO	834.00		3 POBLADO	1	150	11	10.66
58381/0074 166701	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	285 PARQUES PUBLICOS Y/O PLAZAS	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2022-08-22	2022-10-17	629,213.00	629,213.00	0.00	158,763.90	158,763.90	0.00	02 METRO CUADRADO	220.00		3 POBLADO	1	240	30	30.00

SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
13 OCT 2022
RECIBIDO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
 MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción						Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales			Beneficiarios			Avances					
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Tramo	Obra/Localidad	Mód. Ejec.	Fea. Inf. Real	Fea. Fin. Real	Total	R. del Fondo	Intereses R.	Total	R. del Fondo	Intereses R.	U. y Medida	Acrobada	Aprob. Real	U. y Medida	Cantidad	U. y Personas	U. y	U. y	
58382/0075 172288	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	166 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRÁULICO RUMBO A LOS LAVADEROS EN BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-08-22	2022-09-30	97,779.84	97,779.84	0.00	97,779.84	97,779.84	0.00	02 METRO CUADRADOS	850.00		3 POBLADOS	1	90	100	100.00	
58383/0076 176891	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EL MANANTIAL CON CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-03	301,045.00	301,045.00	0.00	43,209.95	43,209.95	0.00	02 METRO CUADRADOS	700.00		3 POBLADOS	1	120	14	14.35	
58384/0077 179390	16 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINISTRACION	2022-08-29	2022-09-30	136,681.23	136,681.23	0.00	136,681.23	136,681.23	0.00	01 METRO LINEAL	168.00		3 POBLADOS	1	23	100	100.00	
58385/0078 194406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE) BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2022-09-02	2022-09-30	287,252.50	287,252.50	0.00	276,708.39	276,708.39	0.00	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADOS	1	68	95	95.98	
58386/0079 202004	05 EDU	16 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	203 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA CRTIZ DE DOMINGUEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-09-28	2022-11-07	367,692.00	367,692.00	0.00	16,649.98	16,649.98	0.00	02 METRO CUADRADOS	39.76		5 ALUMNO	7	8	8	4.63	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO / EJERCICIO 2022						TOTAL			26,352,276.13	26,352,276.11	0.00	23,169,070.36	23,169,070.35	0.00									959

Complementarios: 48 Directa: 28

EDOMEX
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
 UNIDAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
 13 OCT 2022
 FOLIO 100

JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARÍA TERESA GARDUÑO MANARREZ
 TESORERA MUNICIPAL

ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL
