

1, 2, 3 y 6



MUNICIPIO DE
JOCOTITLÁN

Ayuntamiento | Ayuntamiento
Constitucional | Jocotitlán
2016-2018



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Ciudad de Jocotitlan, México a 16 de Octubre del 2017.
OFICIO No.TMJ/0261/2017.

LIC. JOSÉ GÓMEZ MARTINEZ
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN
PRESENTE.**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIÁVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



MTRA. MIREYA MONROY MONROY
TESORERA MUNICIPAL

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS
archivo*




REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.86

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Inceso	Obras/Localidad				Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad
9028/0001	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	EQUIPAMIENTO	006	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2,200,000.00	0.00	1,971,530.50	0.00	0.00	1.00	4	25	62,000	53	89.81
9030/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	EQUIPAMIENTO	006	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	2,665,004.00	0.00	2,447,731.57	0.00	0.00	1.00	4	40	62,000	61	91.84
9035/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	079	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	0.00	419,699.23	0.00	0.00	25.00	4	25	100	29	41.96
9038/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	MANTENIMIENTO	126	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	962,000.00	0.00	451,557.82	0.00	0.00	40.00	4	40	62,000	40	46.95
9039/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	NOMINA	128	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	15,895,286.00	0.00	7,362,950.20	0.00	0.00	100.00	4	100	62,000	38	46.33
9040/0006	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	R	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	3,672,089.22	0.00	3,228,383.28	0.00	0.00	1.00	4	1	62,000	64	87.92
9041/0007	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES FINANCIERAS	R	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	6,900,000.00	0.00	5,007,694.50	0.00	0.00	1.00	4	1	62,000	54	72.58
9042/0008	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	OBLIGACIONES ANTERIORES	O	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,183,823.78	0.00	465,387.56	0.00	0.00	6.00	4	6	62,000	28	39.31
9043/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	240,000.00	0.00	234,004.17	0.00	0.00	40.00	4	40	62,000	58	97.50
9952/0010	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	REHABILITACION	029	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	0.00	930,941.54	0.00	0.00	1.00	4	600	62,000	44	93.10
9954/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	MAQUINARIA Y EQUIPO	113	ADQUISICION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	1,000,000.00	0.00	661,384.66	0.00	0.00	15.00	4	15	62,000	50	66.14
9955/0013	03 ASH	AP AGUA POTABLE	REHABILITACION	083	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	206,000.00	0.00	188,101.00	0.00	0.00	1.00	4	15	62,000	50	91.31
11485/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	SEGURO PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31	145,000.00	0.00	143,016.00	0.00	0.00	90.00	4	50	62,000	98	98.63

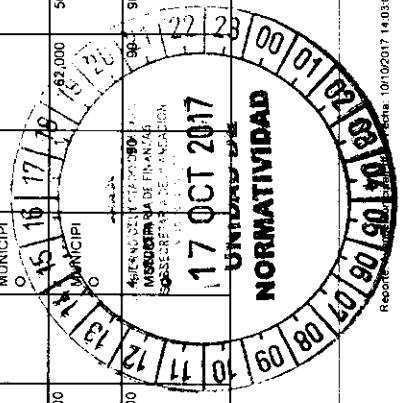




TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios		Avances								
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.			
137401	09	SP SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2017-02-16	2017-12-31		710,900.88	710,900.88	0.00	216,299.79	216,299.79	0.00	4	100.00		4	MUNICIPIO	1	62,000	30	30.43		
TOTAL										37,780,103.88	37,780,103.88	0.00	23,728,881.82	23,728,881.82	0.00									697		


Complementarios: 0 **Directa: 0**

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

M. En C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY
 TESORERA MUNICIPAL




M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL




M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Código	SubPrograma	Programa	Objeto	Modalidad	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		U. Medida	U. Posición	Beneficiarios	U. Posición	PK	Avance
							Total	U. Medida	Total	U. Medida						
9950/0001/27546	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-03-20	2017-07-12	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1	1,000	100	100.00	
9951/0002/27446	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-03-20	2017-06-17	749,400.00	749,400.00	749,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	1	800	100	100.00	
10464/0003/51446	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-03-09	2017-04-28	256,065.20	256,065.20	253,136.76	0.00	01 METRO LINEAL	1	40	100	98.86	
10991/0004/76536	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-03	2017-06-10	560,000.00	560,000.00	505,256.87	0.00	19 POSTE	1	80	91	91.86	
10994/0005/82700	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	ADMINISTRACION	2017-06-08	2017-07-16	197,717.38	197,717.38	194,582.31	0.00	01 METRO LINEAL	1	200	97	98.42	
10995/0006/82856	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-03	2017-08-01	570,000.00	570,000.00	546,082.25	0.00	19 POSTE	1	75	95	95.80	
10997/0007/82899	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-04	2017-05-18	400,000.00	400,000.00	322,530.53	0.00	01 METRO LINEAL	1	150	80	80.63	
10999/0008/82911	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-13	2017-06-11	985,000.00	985,000.00	793,623.28	0.00	01 METRO LINEAL	1	1,200	80	80.57	
11000/0009/82823	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-17	2017-08-15	300,000.00	300,000.00	282,977.14	0.00	01 METRO LINEAL	1	150	93	94.32	
11002/0010/82791	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-18	2017-06-16	370,000.00	370,000.00	369,501.75	0.00	01 METRO LINEAL	1	200	97	96.87	
11759/0011/106964	A	10 REZAGO EDUCATIVO	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	CONTRATO	2017-04-11	2017-05-25	275,000.00	275,000.00	274,998.68	0.00	01 METRO LINEAL	1	150	99	100.00	
11760/0012/106749	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-11	2017-06-23	290,566.52	290,566.52	275,622.70	0.00	19 POSTE	1	24	96	94.86	
11761/0013/106983	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-04-18	2017-05-17	194,649.34	194,649.34	194,649.33	0.00	01 METRO LINEAL	1	450	99	100.00	
11762/0014/106792	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	CONTRATO	2017-07-19	2017-08-14	280,000.00	280,000.00	251,206.23	0.00	01 METRO LINEAL	1	88	88	88.72	






GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado


Clave	Programa	Sub-programa	Descripción de la Obra y/o Acción	Mód. Eje	Ejec. Fin. Pro	Ejec. Fin. Real	Ejec. Fin. Pro	Ejec. Fin. Real	Inversión Ejercida		Métodos Tercales		Beneficiarios		Avances	
									Total	F. de Ejec.	U. Medida	Aprob. Real	U. Medida	Capitales		Pers. Fis.
11763/0015/106761	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	ADMINISTRACION	2017-06-12	2017-06-04	153,300.00	153,300.00	0.00	153,300.00	0.00	0.02 METRO CUADRO	3 POBLAD	1	150	100
11764/0016/106757	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	ADMINISTRACION	2017-05-25	2017-06-16	194,303.00	194,303.00	0.00	194,303.00	0.00	0.01 METRO LINEAL	3 POBLAD	1	200	99
11766/0017/112169	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	214 PRIMARIA DE SERVICIOS BASICOS AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	ADMINISTRACION	2017-04-03	2017-05-02	30,323.08	30,323.08	0.00	30,323.08	0.00	17 PIEZA	5 ALUMINO	1	80	99
12378/0018/106740	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	ADMINISTRACION	2017-06-20	2017-08-20	99,400.00	99,400.00	0.00	99,400.00	0.00	0.02 METRO CUADRO	3 POBLAD	1	100	98
12391/0019/112194	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	ADMINISTRACION	2017-07-19	2017-08-14	72,429.00	72,429.00	0.00	72,429.00	0.00	0.01 METRO LINEAL	3 POBLAD	1	50	64
12393/0020/112197	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONTRATO	2017-06-29	2017-08-28	112,275.68	112,275.68	0.00	108,013.50	0.00	0.01 METRO LINEAL	3 POBLAD	1	200	95
12400/0021/143030	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-07-17	188,735.60	188,735.60	0.00	188,735.60	0.00	0.01 METRO LINEAL	3 POBLAD	1	100	99
12401/0022/143033	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONTRATO	2017-06-05	2017-07-20	220,000.00	220,000.00	0.00	219,999.20	0.00	0.01 METRO LINEAL	5 ALUMINO	1	150	99
12402/0023/142846	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-08-14	500,000.00	500,000.00	0.00	456,647.05	0.00	0.02 METRO CUADRO	3 POBLAD	1	300	90
13055/0024/106723	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	ADMINISTRACION	2017-06-13	2017-08-21	169,950.00	169,950.00	0.00	115,920.00	0.00	0.02 METRO CUADRO	3 POBLAD	1	100	67
13056/0025/106773	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	ADMINISTRACION	2017-06-20	2017-08-21	199,850.00	199,850.00	0.00	180,350.00	0.00	0.02 METRO CUADRO	3 POBLAD	1	180	89
13060/0026/106994	10 REZAGO EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO ENTO COMPLEMENTARIAS	215 PRIMARIA (SANITARIOS)	CONTRATO	2017-04-18	2017-06-01	200,000.00	200,000.00	0.00	120,935.41	0.00	0.02 METRO CUADRO	5 ALUMINO	1	60	60
13061/0027/112186	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	2017-06-29	2017-07-31	18,405.00	18,405.00	0.00	18,360.00	0.00	0.01 METRO LINEAL	3 POBLAD	1	180	99



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Clasificación	Sub-Proyecto	Programa	Objetivo	Actividad	Descripción	Mod. Ejec.	Fec. In. Fin. Pro.		Fec. In. Real.	Fec. Fin. Real.	Fec. Pro. Real.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Depositos		Avance Físico	Avance Financiero		
							Inicio	Terminación				Total	Por Ejercer	Total	Por Ejercer	Total	Por Ejercer				
13063/0028/146210	08 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL TALLER DE HOJALATERIA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2017-08-05	2017-08-07				96,750.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	100	99	100.00
13064/0029/143212	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2017-06-19	2017-07-31				50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	180	100	100.00
13065/0030/112175	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	205 PREESCOLAR (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESCUELA PREPARATORIA NUMERO 56 / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2017-05-16	2017-07-14				750,000.00	748,913.71	748,913.71	748,913.71	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	120	99	99.65
13069/0031/154683	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2017-06-19	2017-07-20				149,404.16	149,404.16	149,404.16	149,404.16	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	60	100	100.00
13070/0032/142993	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE ENDUPEYI CUARTEL CENTRO / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2017-07-05	2017-08-25				101,398.00	101,398.00	90,148.00	90,148.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	135	88	86.91
13071/0033/112214	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LAS ACACIAS / LOS REYES	ADMINISTRACION	2017-06-19	2017-07-22				101,350.00	87,199.61	87,199.61	87,199.61	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	60	85	86.03
13073/0034/143029	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHINDORA CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2017-07-05	2017-07-11				600,000.00	599,707.68	599,707.68	599,707.68	0.00	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	132	99	99.96
13074/0035/155166	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE CALLE SIN NOMBRE HACIA RANCHO DE LOS LEONES / LOS REYES	CONTRATO	2017-07-05	2017-09-09				300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	100	99	100.00
13075/0036/145864	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE COL SAN ANDRES / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2017-07-10	2017-09-14				322,500.00	268,862.65	268,862.65	268,862.65	0.00	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	150	83	83.37
13080/0037/145865	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE PRINCIPAL / COL SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	CONTRATO	2017-07-10	2017-08-31				250,000.00	213,443.96	213,443.96	213,443.96	0.00	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	40	85	85.38
13087/0038/146054	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO A PALACIO / BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2017-07-17	2017-08-31				57,744.00	57,744.00	57,744.00	57,744.00	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	44	100	100.00
13088/0039/146215	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2017-07-17	2017-08-25				162,903.53	162,903.53	140,148.45	140,148.45	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	50	85	86.03
13089/0040/146213	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / LAS ANIMAS VILLAJE	ADMINISTRACION	2017-07-24	2017-08-31				284,157.70	284,157.70	284,157.70	284,157.70	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	20	100	100.00



TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Cuenta	Subprograma	Programa	Objetivo	Actividad	Modo de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Ejercicio	Total	Ingresos		Egresos		Saldo	U. Medida	Cantidad	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida		
										Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado										
13090/0041/145867	B	02 ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD	AMPLIACION DIRECTA	252 CENTROS DE SALUD O UNIDADES MEDICAS	CONTRATO	2017-06-12	2017-09-09	500,000.00	500,000.00	0.00	196,367.42	0.00	196,367.42	0.00	02 METRO CUADRAD	1	600	3	POBLAD	0	45.00	39	38.28
13091/0042/146057	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR) / SAN JOSE BOGUI	ADMINISTRACION	2017-07-24	2017-08-12	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1	600	3	POBLAD	0	1.00	100	100.00
13092/0043/175289	C	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	REHABILITACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONTRATO	2017-06-29	2017-08-02	300,000.00	300,000.00	0.00	250,602.92	0.00	250,602.92	0.00	01 METRO LINEAL	1	200	3	POBLAD	0	255.00	83	83.53
13093/0044/145872	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	2017-07-03	2017-07-31	75,000.00	75,000.00	0.00	74,998.64	0.00	74,998.64	0.00	01 METRO LINEAL	1	400	3	POBLAD	0	1.00	100	100.00
13759/0045/145857	A	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO).	ADMINISTRACION	2017-08-28	2017-10-20	169,900.00	169,900.00	0.00	167,709.58	0.00	167,709.58	0.00	02 METRO CUADRAD	1	120	3	POBLAD	0	630.00	98	98.71
13763/0046/112217	A	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONSTRUCCION COMPLEMENTARIAS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO).	ADMINISTRACION	2017-07-19	2017-08-22	358,780.00	358,780.00	0.00	286,500.00	0.00	286,500.00	0.00	02 METRO CUADRAD	1	120	3	POBLAD	0	1,396.64	79	79.85
13765/0047/145858	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-05-26	2017-07-09	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19 POSTE	1	80	3	POBLAD	0	3.00	100	100.00
13767/0048/155170	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACION	2017-06-03	2017-08-25	139,207.00	139,207.00	0.00	116,935.00	0.00	116,935.00	0.00	01 METRO LINEAL	1	130	3	POBLAD	0	295.00	84	84.00
13768/0049/145860	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-05-24	2017-07-07	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19 POSTE	1	120	3	POBLAD	0	3.00	100	100.00
13769/0050/145861	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-07-10	2017-08-31	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19 POSTE	1	60	3	POBLAD	0	3.00	100	100.00
13774/0051/146055	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-06-05	2017-07-19	180,000.00	180,000.00	0.00	145,982.68	0.00	145,982.68	0.00	19 POSTE	1	20	3	POBLAD	0	3.00	81	81.10
13776/0052/214821	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-06-05	2017-07-19	273,000.00	273,000.00	0.00	234,855.88	0.00	234,855.88	0.00	19 POSTE	1	86	3	POBLAD	0	4.00	86	86.03
13781/0053/146056	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-06-12	2017-07-27	320,000.00	320,000.00	0.00	265,325.40	0.00	265,325.40	0.00	19 POSTE	1	20	3	POBLAD	0	5.00	82	82.91
13783/0054/214834	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	2017-06-19	2017-08-16	320,000.00	320,000.00	0.00	196,124.59	0.00	196,124.59	0.00	19 POSTE	1	20	3	POBLAD	0	4.00	81	81.29
13786/0055/146211	B	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	ADMINISTRACION	2017-08-14	2017-09-15	70,183.00	70,183.00	0.00	58,519.85	0.00	58,519.85	0.00	01 METRO LINEAL	1	20	3	POBLAD	0	165.00	83	83.37

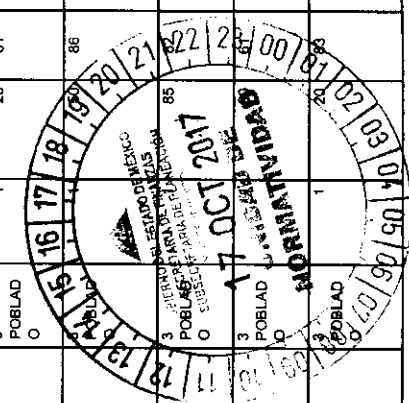

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00


Código	Programa	Subprograma	Iniciativa	Objeto de Inversión	Mod. Espec.	Ejec. Inicial		Ejec. Final		Inversión Aprobada	Inversión Ejecutada	Intensidad B.	U. Medida	U. Medida Aprobada	U. Medida Ejecutada	Beneficiarios	Avances		
						Fac. Inicial	Fac. Final	Fac. Inicial	Fac. Final										
13730/0056/146216	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	258 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO LA PALMA II / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2017-08-14	2017-09-15	51,664.00	51,664.00	0.00	43,895.45	0.00	01	METRO LINEAL	3 POBLADO	50	84.86		
13794/0057/155173	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DE MAYO / LOS REYES	CONTRATO	2017-06-19	2017-08-17	500,000.00	500,000.00	0.00	405,170.16	0.00	19	POSTE	3 POBLADO	58	81.03		
13789/0058/146214	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PALMA II / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	200,000.00	200,000.00	0.00	167,829.60	0.00	19	POSTE	3 POBLADO	50	83.91		
13796/0059/145984	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICIDAD	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AJUN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO BARRIO LA CONASUPO / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2017-07-03	2017-08-31	400,000.00	400,000.00	0.00	358,488.62	0.00	19	POSTE	3 POBLADO	150	89.62		
13797/0060/146217	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRAO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / EX HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2017-09-01	2017-10-31	153,500.00	153,500.00	0.00	52,589.86	0.00	02	METRO CUADRO	3 POBLADO	100	34.26		
13800/0061/215029	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2017-09-01	2017-10-31	688,400.00	688,400.00	0.00	209,703.30	0.00	01	METRO LINEAL	3 POBLADO	20	30.46		
TOTAL											16,478,217.19	16,478,217.19	0.00	14,238,517.64	14,238,517.64	0.00	0.00	0.00	5371

Complementarios: 17

Directa: 44


TOTAL DE OBRAS POR FONDO EJERCICIO: 61

IWAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY
 TESORERA MUNICIPAL




AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

