



1, 2, 3 y 6

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Ciudad de Jocotitlan, México a 18 de Octubre del 2018

OFICIO No.TMJ/0322/2018.

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN**  
**PRESENTE.**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 1ER. PARRAFO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SE REMITE EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M.D.F.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018.

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**MTRA. MIREYA MONROY MONROY**  
**TESORERA MUNICIPAL**



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS  
archivo\*

Plaza Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
[www.jocotitlan.gob.mx](http://www.jocotitlan.gob.mx)



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO


**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,601,075.32 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad	U. Personas	Fin.
16599/0001	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PARA SERVICIOS PUBLICOS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	500,000.00	500,000.00	461,627.21	461,627.21	0.00	25.00	4	25	100	79	92.32
16599/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	3,350,000.00	3,350,000.00	3,142,449.80	3,142,449.80	0.00	1.00	4	25	62,000	81	93.78
16606/0003	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	3,300,000.00	3,300,000.00	2,692,356.69	2,692,356.69	0.00	1.00	4	40	62,000	61	81.56
16608/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	13,454,473.29	13,454,473.29	9,257,704.24	9,257,704.24	0.00	100.00	4	4	62,000	48	68.78
18065/0005	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION DE CÁMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	650,000.00	650,000.00	351,182.61	351,182.61	0.00	15.00	4	15	62,000	83	54.02
18067/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	725,000.00	725,000.00	312,308.23	312,308.23	0.00	100.00	4	4	62,000	12	43.08
18070/0007	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	1,400,000.00	1,400,000.00	1,076,056.68	1,076,056.68	0.00	1.00	4	4	62,000	81	76.84
18071/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	4,950,000.00	4,950,000.00	2,832,886.72	2,832,886.72	0.00	1.00	4	4	62,000	53	57.22
18080/0009	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	7,400,000.00	7,400,000.00	6,043,583.67	6,043,583.67	0.00	1.00	4	1	62,000	72	81.68
18082/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	394,597.90	394,597.90	320,986.62	320,986.62	0.00	40.00	4	40	62,000	100	81.32
18087/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA/TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	500,000.00	500,000.00	229,852.28	229,852.28	0.00	40.00	4	40	62,000	32	45.94
18512/0012	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA DE AGUA POTABLE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	375,000.00	375,000.00	300,120.00	300,120.00	0.00	1.00	4	1	62,000	70	80.03
18516/0013	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y EJERCICIOS ANTERIORES	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2018-02-08	2018-12-31	2,300,000.00	2,300,000.00	2,261,707.28	2,261,707.28	0.00	6.00	4	6	62,000	95	98.32

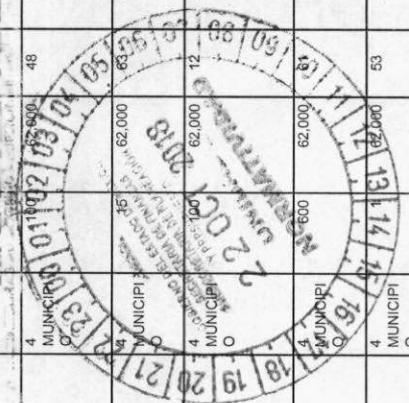





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Total	Métas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		R. del Fondo	Total			R. del Fondo	Total			R. del Fondo	Total	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
20323/0001/51387	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	016 CAMINOS RURALES	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO - SANTIAGO CASANDEJE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2018-04-05	2018-06-29	2018-06-29	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	0.00	0.00	0.61	3 POBLADO	1	1,800	100	100.00
20324/0002/51388	15 AYS	13 ALCANTARILLADO	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2018-04-05	2018-06-29	2018-06-29	757,707.61	757,707.61	0.00	757,707.61	757,707.61	0.00	0.00	886.20	3 POBLADO	1	1,800	100	100.00	
20350/0003/108976	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2018-04-02	2018-05-31	2018-05-31	294,697.65	294,697.65	0.00	294,697.65	294,697.65	0.00	0.00	700.00	3 POBLADO	1	200	100	99.99	
20351/0004/109154	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / RUSO, EL	ADMINISTRACION	2018-04-25	2018-06-23	2018-06-23	493,219.98	493,219.98	0.00	493,219.98	493,219.98	0.00	0.00	8.00	3 POBLADO	1	80	82	82.43	
20352/0005/108668	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE / PROVIDENCIA, LA	CONTRATO	2018-04-25	2018-07-08	2018-07-08	525,000.00	525,000.00	0.00	511,442.02	511,442.02	0.00	0.00	1.00	5 ALUMNADO	1	200	98	97.41	
20353/0006/109288	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2018-04-30	2018-05-31	2018-05-31	80,916.45	80,916.45	0.00	80,916.45	80,916.45	0.00	0.00	2.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00	
20373/0007/109410	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2018-05-02	2018-05-16	2018-05-16	38,473.72	38,473.72	0.00	38,473.72	38,473.72	0.00	0.00	2.00	3 POBLADO	1	25	100	100.00	
20376/0008/108673	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-15	2018-07-15	199,410.70	199,410.70	0.00	199,410.70	199,410.70	0.00	0.00	385.00	3 POBLADO	1	80	100	99.78	
20377/0009/109875	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL DE CAMINO SACA COSECHA / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2018-05-01	2018-07-07	2018-07-07	76,445.47	76,445.47	0.00	76,445.47	76,445.47	0.00	0.00	30.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00	
20378/0010/109879	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	264 PUENTES	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL EN CAMINO SACA COSECHA / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-01	2018-06-12	2018-06-12	164,854.77	164,854.77	0.00	164,854.77	164,854.77	0.00	0.00	87.50	3 POBLADO	1	200	99	100.00	
20380/0011/109278	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINISTRACION	2018-04-02	2018-05-31	2018-05-31	100,153.72	100,153.72	0.00	100,153.72	100,153.72	0.00	0.00	2.00	3 POBLADO	1	50	100	100.00	
20388/0012/109281	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE / OJO DE AGUA	ADMINISTRACION	2018-04-02	2018-05-31	2018-05-31	100,562.55	100,562.55	0.00	100,562.55	100,562.55	0.00	0.00	2.00	3 POBLADO	1	100	100	100.00	
21057/0013/161247	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2018-04-23	2018-05-22	2018-05-22	240,000.00	240,000.00	0.00	239,969.94	239,969.94	0.00	0.00	140.00	3 POBLADO	1	117	100	99.99	
21070/0014/161305	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDAD/IREYES, LOS	ADMINISTRACION	2018-06-02	2018-07-06	2018-07-06	161,750.44	161,750.44	0.00	161,750.44	161,750.44	0.00	0.00	406.00	3 POBLADO	1	23	100	100.00	





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Medida
21071/0015162285	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO-TOLUCA / CABECERA MUNICIPAL	CONTRATO	2018-05-15	2018-07-15	2018-07-15	2018-07-15	71,778.60	71,778.60	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	32	100	100.00
21072/0016161760	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO / MAYORO	ADMINISTRACION	2018-03-21	2018-04-30	2018-04-30	2018-04-30	172,577.52	172,577.52	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	100	100.00
21073/0017160182	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE HACIA LAS VIAS / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2018-05-14	2018-07-30	2018-07-30	2018-07-30	323,843.96	323,843.96	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	500	94	93.58
21074/0018110137	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE CAMINO PASTEJE AL BARRIO DEL PROGRESO / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE)	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-15	2018-07-15	2018-07-15	132,089.15	132,089.15	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	70	70	70.17
21075/0019161306	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO / REYES, LOS	ADMINISTRACION	2018-05-08	2018-06-04	2018-06-04	2018-06-04	111,135.33	111,135.33	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	60	100	100.00
21076/0020161311	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA Y 20 DE NOVIEMBRE / REYES, LOS	ADMINISTRACION	2018-05-14	2018-06-18	2018-06-18	2018-06-18	68,293.92	68,293.92	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	24	100	100.00
21077/0021160143	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-03	2018-08-03	2018-08-03	288,057.07	288,057.07	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	60	77	77.43
21078/0022160341	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NEZAHUALCOYOTL / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	2018-07-01	2018-07-01	214,162.83	214,162.83	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	300	100	99.72
21079/0023160380	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE, BARRIO SAN ANDRES / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	271,000.00	271,000.00	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	60	100	100.00
21080/0024160385	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LAS ESCUELAS BARRIO EMILIANO ZAPATA 1ERA SECCION / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	316,128.53	316,128.53	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	300	100	99.72
21237/0025160390	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DICONSA - POZO DE AGUA / HUOMETLA	CONTRATO	2018-04-01	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	320,151.72	320,151.72	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	40	99	99.73
21238/0026167161	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DICONSA - POZO DE AGUA / HUOMETLA	CONTRATO	2018-05-14	2018-07-12	2018-07-12	2018-07-12	307,356.61	307,356.61	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	30	88	87.82
21239/0027161332	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO 1ERA ETAPA / TIACAQUE	CONTRATO	2018-05-18	2018-08-15	2018-08-15	2018-08-15	587,967.47	587,967.47	0.00	17 PIEZA	5 ALUMNO	1	55	99	99.66
21302/0028110044	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE EN PARAJE NEÑE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-11	2018-06-30	2018-06-30	2018-06-30	140,035.00	140,035.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	88	87.95



MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00


Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	U. Personas	U. Personas
21303/0029/160463	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PARQUE HUNDIDO / SANTA MARIA CITEUDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-06-09	62,256.24	0.00	62,256.24	62,256.24	0.00	0.01	31.00	3	1	40	100	100.00
21304/0030/160459	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES / SANTA MARIA CITEUDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-06-27	71,962.39	0.00	71,962.39	71,962.39	0.00	01	86.00	3	1	200	100	100.00
21305/0031/162315	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE COSTADO DE LA BODEGA 2DA ETAPA / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-08-30	120,187.00	0.00	120,187.00	120,185.90	0.00	02	448.00	3	1	200	100	100.00
21306/0032/161877	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-07-31	199,535.00	0.00	199,535.00	187,614.14	0.00	02	582.00	3	1	100	94	75.66
21307/0033/160460	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE / SANTA MARIA CITEUDEJE	ADMINISTRACION	2018-05-28	2018-06-09	71,460.82	0.00	71,460.82	71,460.82	0.00	01	130.00	3	1	50	100	100.00
21308/0034/160169	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE BUENA VISTA / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-07-30	31,025.00	0.00	31,025.00	23,474.57	0.00	01	750.00	3	1	60	76	75.66
21309/0035/160463	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENITO JUAREZ / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2018-06-01	2018-07-30	180,844.83	0.00	180,844.83	180,844.83	0.00	01	248.00	3	1	150	100	100.00
21310/0036/161757	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / LOS REYES	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-07-30	49,930.62	0.00	49,930.62	49,930.62	0.00	19	4.00	3	1	30	100	100.00
21311/0037/161759	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE ENTORQUE CALLE PRINCIPAL / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2018-06-20	2018-08-08	135,961.86	0.00	135,961.86	135,961.86	0.00	01	230.00	3	1	100	100	100.00
21315/0038/163592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / LOS REYES	CONTRATO	2018-03-23	2018-04-02	297,644.40	0.00	297,644.40	297,644.40	0.00	01	364.00	3	1	60	100	100.00
21321/0039/163113	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA 1 DE 2 / HUEMETLA	CONTRATO	2018-06-18	2018-09-15	850,000.00	0.00	850,000.00	711,604.16	0.00	17	2.00	5	1	60	83	83.72
21881/0040/162308	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / JAVIERES, LOS REYES	CONTRATO	2018-05-07	2018-07-05	230,000.00	0.00	230,000.00	229,657.21	0.00	19	3.00	3	1	25	100	99.85
21882/0041/162314	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / BARRIO DEL PROGRESO	CONTRATO	2018-05-07	2018-07-05	220,000.00	0.00	220,000.00	184,367.31	0.00	19	4.00	3	1	20	84	83.80
21889/0042/161326	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE VICENTE GUERRERO / LOS REYES	CONTRATO	2018-07-03	2018-09-16	400,000.00	0.00	400,000.00	399,920.40	0.00	19	6.00	3	1	57	100	99.98
21903/0043/162318	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2018-06-04	2018-08-30	299,060.00	0.00	299,060.00	132,860.08	0.00	02	1,039.00	3	1	200	44	44.42



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro		Fec. Ter. Pro		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
21906/0044161956	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CENTRO SOCIAL HACIA ABAJO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2018-06-07	2018-08-07	2018-08-07	2018-08-07	96,910.00	95,409.38	0.00	95,409.38	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	100	96	96.46
21921/0045214294	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA / SAN MIGUEL TENOCHTILAN	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA / SAN MIGUEL TENOCHTILAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-01	2018-05-01	2018-05-01	650,000.00	649,999.00	0.00	649,999.00	0.00	02 METRO CUADRAD	5 ALUMNO	1	100	100	100.00
21922/0046162322	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2018-06-28	2018-07-28	2018-07-28	2018-07-28	200,000.04	200,000.04	0.00	200,000.04	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100	100.00
22431/0047161322	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN / LOS REYES	CONTRATO	2018-07-03	2018-09-16	2018-09-16	2018-09-16	700,000.00	699,906.93	0.00	699,906.93	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	60	100	99.89
22430/0048268400	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-02	2018-08-02	2018-08-02	300,000.00	266,749.20	0.00	266,749.20	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	50	89	88.92
22433/0049268401	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA PALMA 1 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-02	2018-08-02	2018-08-02	300,000.00	269,448.99	0.00	269,448.99	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	100	80	89.82
22438/0050268402	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE LA LOMITA / SIFFARI	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-02	2018-08-02	2018-08-02	200,000.00	182,360.17	0.00	182,360.17	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	60	91	91.18
22442/0051214250	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL HACIA LAS ESCUELAS / BARRIO LA VENTA	CONTRATO	2018-06-18	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	371,159.99	338,696.20	0.00	338,696.20	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	24	91	91.25
22446/0052214296	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	Z MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIOS	207 PREPARATORIA A (AULAS)	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA / SANTA MARIA CITEDEJE	CONTRATO	2018-07-02	2018-07-10	2018-07-10	2018-07-10	179,957.62	179,957.62	0.00	179,957.62	0.00	17 PIEZA	5 ALUMNO	1	100	100	100.00
22451/0053272663	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2018-06-02	2018-07-06	2018-07-06	2018-07-06	69,032.24	69,032.24	0.00	69,032.24	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	60	100	100.00
22452/0054214375	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE SHISH / SANTA MARIA CITEDEJE	ADMINISTRACION	2018-07-01	2018-07-30	2018-07-30	2018-07-30	266,336.50	266,336.50	0.00	266,336.50	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	500	100	100.00
22454/0055268708	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL / MAVORO	CONTRATO	2018-07-05	2018-07-20	2018-07-20	2018-07-20	245,000.00	73,319.83	0.00	73,319.83	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	30	30	29.93
22455/0056268515	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AJUN COSTADO DEL AUDITORIO / PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2018-07-15	2018-08-10	2018-08-10	2018-08-10	80,156.00	80,156.00	0.00	80,156.00	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	1	22	100	100.00
23319/0057284104	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL / ZACUALPAN	CONTRATO	2018-06-18	2018-08-16	2018-08-16	2018-08-16	135,000.00	68,787.72	0.00	68,787.72	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	50	51	50.95
23320/0058268574	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS FLORES / MAYORO	CONTRATO	2018-07-05	2018-09-20	2018-09-20	2018-09-20	249,909.50	157,293.73	0.00	157,293.73	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	1	36	63	62.94

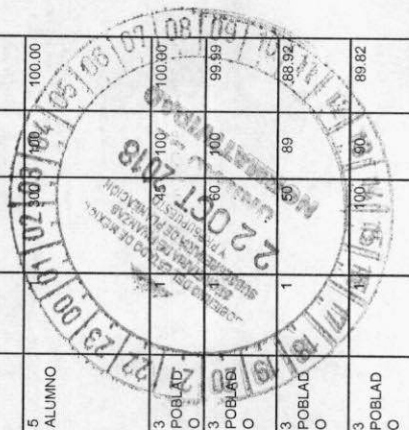



GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2018. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
				Inicio	Obra/Localidad		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	U. Personas	U. Medida	U. Personas	Fin.	Fin.
23328/0059/284130	17 URB	URBANIZACION	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASPHALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	96,435.35	96,435.35	0.00	96,435.35	0.00	348.00	3 POBLADO	1	80	100	100.00	
23349/0060/284150	17 URB	URBANIZACION	B. AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	160,972.05	160,972.05	0.00	130,111.41	0.00	15.00	3 POBLADO	80	81	80.83	80.83	
23350/0061/285720	17 URB	URBANIZACION	B. AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	49,988.93	49,988.93	0.00	42,636.90	0.00	8.00	3 POBLADO	60	55	65.29	65.29	
23351/0062/285727	17 URB	URBANIZACION	B. AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	49,513.11	49,513.11	0.00	40,829.35	0.00	7.00	3 POBLADO	82	82	82.46	82.46	
23352/0063/284905	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A. CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINISTRACION	150,121.04	150,121.04	0.00	63,083.70	0.00	140.00	5 ALUMNO	100	42	42.02	42.02	
23353/0064/284055	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B. AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO CASANDEJE, TERCERA ETAPA DE 3 / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,531.00	3 POBLADO	600	100	100.00	100.00	
23354/0065/214295	17 URB	URBANIZACION	B. AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDEMAS CUARTEL CENTRO / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	199,939.11	199,939.11	0.00	136,339.35	0.00	3.00	3 POBLADO	20	68	68.19	68.19	
TOTAL							18,072,796.68	18,072,796.68	0.00	16,677,968.31	0.00					5911		

Complementarios: 47

Directa: 18

TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 65

LIC. IVAN DE JESÚS  
ESQUER CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

M. En C. y C.P. MIREYA  
MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

ARQ. FELICIANO DIAZ  
RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018

LIC. EDUARDO CARREOLA  
GARCÍA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018
