



1, 2, 3 y 6

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante".

Ciudad de Jocotitlan, México a 31 de Diciembre del 2018

OFICIO No.TMJ/0382/2018.

A/R

**MTRA. AZALEA DEL CARMEN CLEMENTE BLANCO**  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN**  
**PRESENTE.**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 1ER. PARRAFO DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, SE REMITE EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M.D.F.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2018 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE **AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE

**MTRA. MIREYA MONROY MONROY**  
**TESORERA MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**JOCOTITLÁN, MEX.**

2016-2018

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS  
archivo\*



Plaza Constituyentes N°1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0191 // 712 122 9570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
[www.jocotitlan.gob.mx](http://www.jocotitlan.gob.mx)




GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,601,075.32

REINTEGRO: \$ 0.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción				Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales		Beneficiarios		Avances						
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fac. In. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
16599/0001	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	07/9	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS MAQUINARIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	595,897.13	595,897.13	0.00	595,897.13	595,897.13	0.00	63 MAQUINARIA	25.00		4 MUNICIPAL	25	100	91	100.00
16599/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	3,759,557.38	3,759,557.38	0.00	3,759,557.38	3,759,557.38	0.00	66 LITRO	1.00		4 MUNICIPAL	25	62,000	94	100.00
16696/0003	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SEGURIDAD PUBLICA/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	3,742,769.43	3,742,769.43	0.00	3,742,769.43	3,742,769.43	0.00	66 LITRO	1.00		4 MUNICIPAL	40	62,000	88	100.00
16698/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128	SUeldo Base / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	13,967,041.25	13,967,041.25	0.00	13,967,041.25	13,967,041.25	0.00	80 ELEMENTO	100.00		4 MUNICIPAL	100	62,000	100	100.00
18065/0005	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113	ADQUISICION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	643,948.82	643,948.82	0.00	643,948.82	643,948.82	0.00	50 EQUIPO	15.00		4 MUNICIPAL	15	62,000	82	100.00
18067/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	ADQUISICION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	312,308.23	312,308.23	0.00	312,308.23	312,308.23	0.00	50 EQUIPO	100.00		4 MUNICIPAL	100	62,000	12	100.00
18070/0007	08 ADM	EP EDIFICIOS PUBLICOS Y DE USO COMUN	C REHABILITACION	029	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	1,189,451.71	1,189,451.71	0.00	1,189,451.71	1,189,451.71	0.00	02 METRO CUADRO	1.00		4 MUNICIPAL	600	62,000	100	100.00
18077/0008	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	4,612,450.72	4,595,249.72	17,201.00	4,595,249.72	4,595,249.72	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPAL	1	62,000	100	99.57
18080/0009	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	9,053,017.35	9,053,017.35	0.00	9,053,017.35	9,053,017.35	0.00	81 PAGO	1.00		4 MUNICIPAL	1	62,000	100	100.00
18082/0010	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	320,986.62	320,986.62	0.00	320,986.62	320,986.62	0.00	50 EQUIPO	40.00		4 MUNICIPAL	40	62,000	100	100.00
18087/0011	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA/ TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	314,940.60	314,940.60	0.00	314,940.60	314,940.60	0.00	34 VEHICULO	40.00		4 MUNICIPAL	4	62,000	18	100.00
18512/0012	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083	SISTEMA DE AGUA POTABLE APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	393,587.00	393,587.00	0.00	393,587.00	393,587.00	0.00	15 SISTEMA	1.00		4 MUNICIPAL	1	62,000	100	100.00
18518/0013	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134	OBRA Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACION	2018-02-08	2018-12-31	2,539,199.82	2,539,199.82	0.00	2,539,199.82	2,539,199.82	0.00	81 PAGO	6.00		4 MUNICIPAL	1	62,000	100	100.00





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 41,601,075.32 REINTEGRO: \$ 0.00

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
(Cifras en Pesos)  
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado


REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros

Sector		Programa		SubPrograma		Inciso		Obr/Localidad		Mod. Elec.		Fac. In. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obr/Localidad	Mod. Elec.	Fac. In. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Acrob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	Fis.	Fin.		
20906/0014	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMEN TO	121	SEGURO PARA POLICIAS/ TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2018-02-08	2018-12-31	135,520.00	135,520.00	0.00	135,520.00	135,520.00	0.00	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPI O	90	90	100	100.00					
20906/0015	GOB	SEGURIDAD PUBLICA	EQUIPAMEN TO	121	EXAMENES DE CONFIANZA DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINIST RACION	2018-02-08	2018-12-31	37,600.26	37,600.26	0.00	37,600.26	37,600.26	0.00	50 EQUIPO	90.00	4 MUNICIPI O	90	90	100	100.00					
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 15									41,618,276.32	41,601,075.32	17,201.00	41,601,075.32	41,601,075.32	0.00												
Complementarios: 0									Directa: 0		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	



LIC. IVAN DE JESÚS  
ESQUER-GRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2018-2019



M. En C. Y C.P. MIREYA  
MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2015-2018



ARQ. FELICIANO DÍAZ  
RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



LIC. EDUARDO CARREOLA  
GARCIA  
CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2015-2018





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 28,920,689.00 RENTEGRO: \$ 0.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inso	Orzal, localidad	Mod. Elec.	Fec. Inj. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Metas Totales	U. Medida	Beneficiarios	Avances		
							Fec. Inj. Real	Fec. Ter. Real								Apr. Real	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.	
20323/0001	17 URB	UR	B	016	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMILCO - SAN TIAAGO CASANDEJE / SAN JUAN COAJOMILCO	CONTRAT	2018-04-05	2018-06-29	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	04 KILOM ETRO	0.61	3 POBLAD	1	1,800	100	100.00
20324/0002	15 AYS	UR	B	216	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT	2018-04-05	2018-06-29	757,707.61	757,707.61	0.00	757,707.61	757,707.61	0.00	03 METRO CUBICO	886.20	3 POBLAD	1	1,000	100	100.00
20350/108976	17 URB	UR	A	169	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / ANIMIAS VILLEJE, LAS	ADMINIST RACION	2018-04-02	2018-05-31	294,697.65	294,697.65	0.00	294,697.65	294,697.65	0.00	02 METRO C UADRAD	700.00	3 POBLAD	1	200	100	100.00
20351/0004	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / RUSO, EL	ADMINIST RACION	2018-04-25	2018-06-23	448,563.24	448,563.24	0.00	448,563.24	448,563.24	0.00	19 POSTE	8.00	3 POBLAD	1	80	91	100.00
20352/0005	06 EDU	UR	A	222	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE / PROVIDENCIA, LA	CONTRAT	2018-04-25	2018-07-08	523,358.79	523,358.79	0.00	523,358.79	523,358.79	0.00	17 PIEZA	1.00	5 ALUMNO	1	200	100	100.00
20353/0006	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST RACION	2018-04-30	2018-05-31	80,916.45	80,916.45	0.00	80,916.45	80,916.45	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00
20373/0007	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2018-05-02	2018-05-16	38,473.72	38,473.72	0.00	38,473.72	38,473.72	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD	1	25	100	100.00
20376/109875	15 AYS	UR	B	256	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINIST RACION	2018-05-15	2018-07-15	199,410.70	199,410.70	0.00	199,410.70	199,410.70	0.00	01 METRO LINEAL	385.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00
20377/109875	17 URB	UR	A	264	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL DE CAMINO SACA COSECHA / CONCEPCION CARO	ADMINIST RACION	2018-05-01	2018-07-07	76,445.47	76,445.47	0.00	76,445.47	76,445.47	0.00	02 METRO C UADRAD	30.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00
20378/109979	17 URB	UR	A	264	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL EN CAMINO SACA COSECHA / SANTA MARIA CITEDEJE	ADMINIST RACION	2018-05-01	2018-06-12	164,854.77	164,854.77	0.00	164,854.77	164,854.77	0.00	02 METRO C UADRAD	87.50	3 POBLAD	1	200	99	100.00
20380/109278	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BOMBA DE RIESGO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINIST RACION	2018-04-02	2018-05-31	100,153.72	100,153.72	0.00	100,153.72	100,153.72	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD	1	80	100	100.00
20381/109281	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / OJO DE AGUA	ADMINIST RACION	2018-04-02	2018-05-31	100,562.55	100,562.55	0.00	100,562.55	100,562.55	0.00	17 PIEZA	2.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00
21057/0013	15 AYS	UR	B	256	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST RACION	2018-04-23	2018-05-22	239,969.94	239,969.94	0.00	239,969.94	239,969.94	0.00	01 METRO LINEAL	140.00	3 POBLAD	1	100	100	100.00
21070/0014	17 URB	UR	A	169	CONSTRUCCION CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDAD/REVES, LOS	ADMINIST RACION	2018-06-02	2018-07-06	161,750.44	161,750.44	0.00	161,750.44	161,750.44	0.00	02 METRO C UADRAD	406.00	3 POBLAD	1	23	100	100.00





MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 (Cifras en Pesos) Avances Físicos y Financieros  
 Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

Control		Sector		Programa		SubPrograma		Inciso		ObjetLocalidad		Med. Elec.		Fac. In. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	ObjetLocalidad	Med. Elec.	Fac. In. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
20323/	17 URB	UR	B	016	MODERNIZACION Y AMPLIACION DE CAMINO SAN JUAN COAJOMULCO-SANTOAGO CASANDEJE / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRAT	2018-04-05	2018-06-29	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	1,071,692.39	1,071,692.39	0.00	04 KILOM ETRO	0.81	3	POBLAD	1	1,800	100	100.00		
20324/	15 AYS	UR	B	216	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRAT	2018-04-05	2018-06-29	757,707.61	757,707.61	0.00	757,707.61	757,707.61	0.00	757,707.61	757,707.61	0.00	03 METRO CUBICO	886.20	3	POBLAD	1	1,000	100	100.00		
20350/	17 URB	UR	A	169	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRULICO EN CALLE PRINCIPAL / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINIST	2018-04-02	2018-05-31	294,697.65	294,697.65	0.00	294,697.65	294,697.65	0.00	294,697.65	294,697.65	0.00	02 METRO C UADRAD	700.00	3	POBLAD	1	200	100	100.00		
20351/	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE A LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA / RISO, EL	ADMINIST	2018-04-25	2018-06-23	448,563.24	448,563.24	0.00	448,563.24	448,563.24	0.00	448,563.24	448,563.24	0.00	19 POSTE	8.00	3	POBLAD	1	80	91	100.00		
20352/	06 EDU	UR	A	222	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE / PROVIDENCIA, LA	CONTRAT	2018-04-25	2018-07-08	523,358.79	523,358.79	0.00	523,358.79	523,358.79	0.00	523,358.79	523,358.79	0.00	17 PIEZA	1.00	5	ALUMNO	1	200	100	100.00		
20353/	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARTE ALTA / BARRIO EL LINDERO	ADMINIST	2018-04-30	2018-05-31	80,916.45	80,916.45	0.00	80,916.45	80,916.45	0.00	80,916.45	80,916.45	0.00	19 POSTE	2.00	3	POBLAD	1	100	100	100.00		
20373/	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST	2018-05-02	2018-05-16	38,473.72	38,473.72	0.00	38,473.72	38,473.72	0.00	38,473.72	38,473.72	0.00	19 POSTE	2.00	3	POBLAD	1	25	100	100.00		
20376/	15 AYS	UR	B	266	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO AUN COSTADO DE LA CALLE BARCELONA / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINIST	2018-05-15	2018-07-15	199,410.70	199,410.70	0.00	199,410.70	199,410.70	0.00	199,410.70	199,410.70	0.00	01 METRO LINEAL	385.00	3	POBLAD	1	80	100	100.00		
20377/	17 URB	UR	A	264	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL DE CAMINO SACA COSECHA / CONCEPCION CARO	ADMINIST	2018-05-01	2018-07-07	76,445.47	76,445.47	0.00	76,445.47	76,445.47	0.00	76,445.47	76,445.47	0.00	02 METRO C UADRAD	30.00	3	POBLAD	1	100	100	100.00		
20378/	17 URB	UR	A	264	CONSTRUCCION DE PUENTE VECINAL EN CAMINO SACA COSECHA / SANTA MARIA CITEENDEJE	ADMINIST	2018-05-01	2018-06-12	164,854.77	164,854.77	0.00	164,854.77	164,854.77	0.00	164,854.77	164,854.77	0.00	02 METRO C UADRAD	87.50	3	POBLAD	1	200	99	100.00		
20380/	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BOMBA DE RIEGO / BARRIO DE LA TOMA ENDARE	ADMINIST	2018-04-02	2018-05-31	100,153.72	100,153.72	0.00	100,153.72	100,153.72	0.00	100,153.72	100,153.72	0.00	19 POSTE	2.00	3	POBLAD	1	50	100	100.00		
20388/	17 URB	UR	B	011	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / OJO DE AGUA	ADMINIST	2019-04-02	2019-05-31	100,562.55	100,562.55	0.00	100,562.55	100,562.55	0.00	100,562.55	100,562.55	0.00	17 PIEZA	2.00	3	POBLAD	1	100	100	100.00		
21067/	15 AYS	UR	B	266	REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL CENTRO SOCIAL / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINIST	2018-04-23	2018-05-22	239,969.94	239,969.94	0.00	239,969.94	239,969.94	0.00	239,969.94	239,969.94	0.00	01 METRO LINEAL	140.00	3	POBLAD	1	117	100	100.00		
21070/	17 URB	UR	A	169	CONSTRUCCION CON CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA SOLEDAD/REYES, LOS	ADMINIST	2018-06-02	2018-07-06	161,750.44	161,750.44	0.00	161,750.44	161,750.44	0.00	161,750.44	161,750.44	0.00	02 METRO C UADRAD	406.00	3	POBLAD	1	23	100	100.00		






MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
(Cifras en Pesos)  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Objetivos/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Medidas Totales		Beneficiarios		Avances		
										R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
21071/162285	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA CARRETERA LIBRE ATLACOMULCO-TOLUCA / CABECERA MUNICIPAL	CONTRAT O	2018-05-15	2018-07-15	75,546.00	75,546.00	0.00	75,546.00	0.00	75,546.00	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	3 POBLAD O	1	32	100	100.00
21072/161780	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO / MAYORCA	ADMINISTRACION	2018-03-21	2018-04-30	172,577.52	172,577.52	0.00	172,577.52	0.00	172,577.52	0.00	01 METRO LINEAL	120.00	3 POBLAD O	1	200	100	100.00
21073/160182	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION CON CONCRETO Y ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	ADMINISTRACION	2018-05-14	2018-07-30	329,943.95	329,943.95	0.00	329,943.95	0.00	329,943.95	0.00	02 METRO C UADRADO	1,200.00	3 POBLAD O	1	500	96	100.00
21074/110137	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO	ADMINISTRACION	2018-05-15	2018-07-15	185,939.29	185,939.29	0.00	185,939.29	0.00	185,939.29	0.00	02 METRO C UADRADO	105.00	3 POBLAD O	1	60	99	100.00
21075/161306	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN DRENAJE SANITARIO / REYES. LOS	ADMINISTRACION	2018-05-08	2018-06-04	111,135.33	111,135.33	0.00	111,135.33	0.00	111,135.33	0.00	01 METRO LINEAL	21.77	3 POBLAD O	1	60	100	100.00
21076/161311	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	A CONSTRUCCION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA LOMA Y 20 DE NOVIEMBRE / REYES. LOS	ADMINISTRACION	2018-05-14	2018-06-18	68,293.92	68,293.92	0.00	68,293.92	0.00	68,293.92	0.00	01 METRO LINEAL	78.00	3 POBLAD O	1	24	100	100.00
21077/160143	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / SAN JOSE BOQUILOS	CONTRAT O	2018-06-04	2018-06-03	367,426.29	367,426.29	0.00	367,426.29	0.00	367,426.29	0.00	19 POSTE	6.00	3 POBLAD O	1	60	99	100.00
21078/160341	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NEZAHUALCOYOTL / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2018-05-01	2018-07-01	255,600.15	255,600.15	0.00	255,600.15	0.00	255,600.15	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	30	92	100.00
21079/160380	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE. BARRIO SAN ANDRES / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	271,000.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	80	100	100.00
21080/160385	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A LAS ESCUELAS BARRIO EMILIANO ZAPATA 1ERA SECCION / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	315,128.53	315,128.53	0.00	315,128.53	0.00	315,128.53	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD O	1	300	100	100.00
21237/160396	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRICIDAD EN CALLE 76 HACIA LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COLONIA LA PRESA / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRAT O	2018-04-01	2018-06-30	320,151.72	320,151.72	0.00	320,151.72	0.00	320,151.72	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD O	1	400	99	100.00
21238/167161	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DICONSA - POZO DE AGUA / HUENETLA	CONTRAT O	2018-05-14	2018-07-12	348,915.36	348,915.36	0.00	348,915.36	0.00	348,915.36	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD O	1	30	100	100.00
21239/161332	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	307 PREPARATORIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELEBACHILLERATO 1ERA ETAPA / TIACACUE	CONTRAT O	2018-05-18	2018-08-15	589,766.49	589,766.49	0.00	589,766.49	0.00	589,766.49	0.00	17 PIEZA	2.00	5 ALUMNO	1	55	100	100.00
21302/110044	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE EN PARAJE NENE / SANTA MARIA CITEÑEJE	ADMINISTRACION	2018-05-11	2018-06-30	123,170.02	123,170.02	0.00	123,170.02	0.00	123,170.02	0.00	01 METRO LINEAL	250.00	3 POBLAD O	1	200	88	100.00

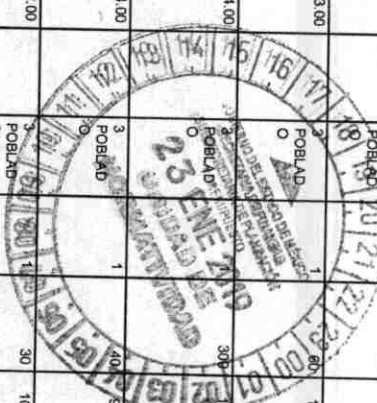




GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,698.00 RENTEGRO: \$ 0.00

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Control		Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obrasilocalidad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Metas Totales	U. Medida	Beneficiarios	Avances	
																				U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.	
21303/	0029	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PARQUE HUINDO / SANTA MARIA CITEENDELE	ADMINISTRACION RACION	2018-05-28	2018-06-09	62,256.24	62,256.24	0.00	62,256.24	62,256.24	0.00	62,256.24	62,256.24	0.00	01 METRO LINEAL	31.00	3 POBLAD	1	40	100.00
21304/	0030	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL CUARTEL LOURDES / SANTA MARIA CITEENDELE	ADMINISTRACION RACION	2018-05-28	2018-06-27	71,962.39	71,962.39	0.00	71,962.39	71,962.39	0.00	71,962.39	71,962.39	0.00	01 METRO LINEAL	88.00	3 POBLAD	1	60	100.00
21305/	0031	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA BODEGA 2DA ETAPA / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION RACION	2018-06-04	2018-08-30	120,185.90	120,185.90	0.00	120,185.90	120,185.90	0.00	120,185.90	120,185.90	0.00	02 METRO C UADRAD	448.00	3 POBLAD	1	209	100.00
21306/	0032	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION RACION	2018-06-01	2018-07-31	187,614.14	187,614.14	0.00	187,614.14	187,614.14	0.00	187,614.14	187,614.14	0.00	02 METRO C UADRAD	592.00	3 POBLAD	1	100	100.00
21307/	0033	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHICHE / SANTA MARIA CITEENDELE	ADMINISTRACION RACION	2018-05-28	2018-06-09	71,460.82	71,460.82	0.00	71,460.82	71,460.82	0.00	71,460.82	71,460.82	0.00	01 METRO LINEAL	130.00	3 POBLAD	1	50	100.00
21308/	0034	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE BUENA VISTA / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION RACION	2018-06-01	2018-07-30	39,224.57	39,224.57	0.00	39,224.57	39,224.57	0.00	39,224.57	39,224.57	0.00	01 METRO LINEAL	750.00	3 POBLAD	1	60	100.00
21309/	0035	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE COLONIA BENITO JUAREZ / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION RACION	2018-06-01	2018-07-30	180,844.83	180,844.83	0.00	180,844.83	180,844.83	0.00	180,844.83	180,844.83	0.00	01 METRO LINEAL	248.00	3 POBLAD	1	150	100.00
21310/	0036	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / LOS REYES	ADMINISTRACION RACION	2018-06-04	2018-07-30	49,930.62	49,930.62	0.00	49,930.62	49,930.62	0.00	49,930.62	49,930.62	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	30	100.00
21311/	0037	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE ENTROMQUE CALLE PRINCIPAL / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION RACION	2018-06-20	2018-08-08	135,961.86	135,961.86	0.00	135,961.86	135,961.86	0.00	135,961.86	135,961.86	0.00	01 METRO LINEAL	230.00	3 POBLAD	1	100	100.00
21315/	0038	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / LOS REYES	CONTRATO	2018-03-23	2018-04-02	297,644.40	297,644.40	0.00	297,644.40	297,644.40	0.00	297,644.40	297,644.40	0.00	01 METRO LINEAL	364.00	3 POBLAD	1	80	100.00
21321/	0039	08 EDU	15 INFRAESTR UCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	222 SECUNDARIA (AULAS)	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS ETAPA 1 DE 2 / HUENMETLA	CONTRATO	2018-06-18	2018-09-15	849,854.69	849,854.69	0.00	849,854.69	849,854.69	0.00	849,854.69	849,854.69	0.00	17 PIEZA	2.00	5 ALUMNO	1	90	100.00
21881/	0040	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / JAVIERES, LOS	CONTRATO	2018-05-07	2018-07-05	229,657.21	229,657.21	0.00	229,657.21	229,657.21	0.00	229,657.21	229,657.21	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD	1	20	100.00
21882/	0041	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / BARRIO DEL PROGRESO	CONTRATO	2018-05-07	2018-07-05	218,027.74	218,027.74	0.00	218,027.74	218,027.74	0.00	218,027.74	218,027.74	0.00	19 POSTE	4.00	3 POBLAD	1	20	100.00
21889/	0042	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / BARRIO DEL PROGRESO	CONTRATO	2018-07-03	2018-09-16	399,920.40	399,920.40	0.00	399,920.40	399,920.40	0.00	399,920.40	399,920.40	0.00	19 POSTE	5.00	3 POBLAD	1	57	100.00
21903/	0043	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / CASA BLANCA	ADMINISTRACION RACION	2018-06-04	2018-08-30	298,674.96	298,674.96	0.00	298,674.96	298,674.96	0.00	298,674.96	298,674.96	0.00	02 METRO C UADRAD	1,039.00	3 POBLAD	1	200	100.00

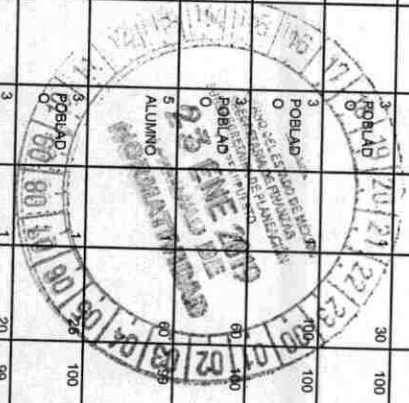




MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 (Cifras en Pesos) Avances Físicos y Financieros

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada										Inversión Ejecutada										Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inicio	Oréal/Localidad	Mod. Elec.	Fec. Inj. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprch. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fn.										
21906/004	17 URB	UR	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	189 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIRBALIUCO EN CALLE SIN NOMBRE DEL CENTRO SOCIAL HACIA ABAYAO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2018-06-07	2018-08-07	95,409.38	95,409.38	0.00	95,409.38	95,409.38	0.00	95,409.38	95,409.38	0.00	02	390.00		02	1	100	96	100.00										
21921/0045	08 EDU	UR	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA / DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PREPARATORIA / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-04-01	2018-05-01	649,999.00	649,999.00	0.00	649,999.00	649,999.00	0.00	649,999.00	649,999.00	0.00	02	426.00		02	1	300	100	100.00										
21922/0046	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	268 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2018-06-28	2018-07-28	200,000.04	200,000.04	0.00	200,000.04	200,000.04	0.00	200,000.04	200,000.04	0.00	01	225.00		01	1	45	100	100.00										
22421/161322	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE EL ECTRIFICACION EN CALLE EL JAZMIN / LOS REVES	CONTRATO	2018-07-03	2018-08-16	699,906.93	699,906.93	0.00	699,906.93	699,906.93	0.00	699,906.93	699,906.93	0.00	19	10.00		19	1	80	100	100.00										
22430/0048	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO EL RINCON / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-02	299,972.27	299,972.27	0.00	299,972.27	299,972.27	0.00	299,972.27	299,972.27	0.00	19	3.00		19	1	50	100	100.00										
22433/0049	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA EL PALMA 11 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-02	299,965.57	299,965.57	0.00	299,965.57	299,965.57	0.00	299,965.57	299,965.57	0.00	19	3.00		19	1	100	100	100.00										
22439/0050	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA LOMITA / SIFRARI	CONTRATO	2018-06-04	2018-08-02	199,942.24	199,942.24	0.00	199,942.24	199,942.24	0.00	199,942.24	199,942.24	0.00	19	4.00		19	1	60	100	100.00										
22442/0051	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA LOMITA / SIFRARI	CONTRATO	2018-06-18	2018-08-16	369,769.02	369,769.02	0.00	369,769.02	369,769.02	0.00	369,769.02	369,769.02	0.00	19	8.00		19	1	24	99	100.00										
22446/0052	05 EDU	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	207 ZEMEORAMI PREPARATORIA (AULAS)	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PREPARATORIA / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2018-07-02	2018-07-10	179,957.62	179,957.62	0.00	179,957.62	179,957.62	0.00	179,957.62	179,957.62	0.00	17	4.00		17	1	100	100	100.00										
22451/0053	17 URB	UR	A CONSTRUCCION COMPLEMEN TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2018-06-02	2018-07-06	69,032.24	69,032.24	0.00	69,032.24	69,032.24	0.00	69,032.24	69,032.24	0.00	02	203.00		02	1	60	100	100.00										
22452/0054	16 AYS	AP	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE PARA JE SHISHU / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2018-07-01	2018-07-30	266,336.50	266,336.50	0.00	266,336.50	266,336.50	0.00	266,336.50	266,336.50	0.00	01	804.00		01	1	800	100	100.00										
22454/0055	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL / MAVORO	CONTRATO	2018-07-05	2018-07-20	244,294.48	244,294.48	0.00	244,294.48	244,294.48	0.00	244,294.48	244,294.48	0.00	19	3.00		19	1	20	100	100.00										
22455/0056	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION AUN COSTADO DEL AUDITORIO / PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2018-07-15	2018-08-10	80,156.00	80,156.00	0.00	80,156.00	80,156.00	0.00	80,156.00	80,156.00	0.00	17	1.00		17	1	22	100	100.00										
23319/284104	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PRINCIPAL / ZACUALPAN	CONTRATO	2018-06-18	2018-08-16	99,138.25	99,138.25	0.00	99,138.25	99,138.25	0.00	99,138.25	99,138.25	0.00	19	4.00		19	1	50	73	100.00										
23320/0058	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LOS FLORES / MAYORO	CONTRATO	2018-07-05	2018-08-20	249,909.50	249,909.50	0.00	249,909.50	249,909.50	0.00	249,909.50	249,909.50	0.00	19	4.00		19	1	36	100	100.00										








MUNICIPIO: 049 JOCOTITLAN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 (Cifras en Pasos) Registro de Avances Físicos y Financieros

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Ingreso	Objetividad	Mod. Elec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios			Avances	
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fs.	Fin.
23328/0099/284130	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / EX-HACIENDA SAN JOSE VILLEJE	ADMINISTRACION	2018-08-15	2018-09-20	96,435.35	96,435.35	0.00	96,435.35	96,435.35	0.00	02 METRO CUBICADO	348.00	3	POBLADO	1	80	100	100.00
23349/0060/284150	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2018-08-18	2018-09-20	160,972.05	160,972.05	0.00	160,972.05	160,972.05	0.00	18 LUMINARIAS	15.00	3	POBLADO	1	80	100	100.00
23350/0061/285720	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MAINTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO / BARRIO DE CIARRA	ADMINISTRACION	2018-08-20	2018-09-10	49,988.98	49,988.98	0.00	49,988.98	49,988.98	0.00	18 LUMINARIAS	8.00	3	POBLADO	1	60	100	100.00
23351/0062/285727	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO / BARRIO DE GUADALUPE	ADMINISTRACION	2018-08-20	2018-09-10	49,513.11	49,513.11	0.00	49,513.11	49,513.11	0.00	18 LUMINARIAS	7.00	3	POBLADO	1	150	100	100.00
23352/0063/284905	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	211 PRIMARIA (ALULS)	MEJORAMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO / BARRIO DE LA LOMA ENDARE	ADMINISTRACION	2018-08-15	2018-09-28	150,013.72	150,013.72	0.00	150,013.72	150,013.72	0.00	02 METRO CUBICADO	140.00	5	ALUMNO	1	100	100	100.00
23353/0064/284095	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTIAGO CASANDEJE, TERCERA ETAPA DE 3 / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2018-08-20	2018-10-19	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,531.00	3	POBLADO	1	600	100	100.00
23354/0065/214295	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO CARDENAS CUARTEL CENTRO / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2018-05-01	2018-07-01	199,939.11	199,939.11	0.00	199,939.11	199,939.11	0.00	19 POSTE	3.00	3	POBLADO	1	20	100	100.00
23989/0067/284086	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LAZARO CARDENAS / SAN JUAN COAJOMULCO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA LAZARO CARDENAS / SAN JUAN COAJOMULCO	CONTRATO	2018-07-02	2018-09-15	499,213.28	499,213.28	0.00	499,213.28	499,213.28	0.00	03 METRO CUBICO	27.40	5	ALUMNO	1	300	100	100.00
24002/0068/287108	17 URB	UR URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMENTARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CUARTEL LOURES PARA EL ARENAL / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2018-07-01	2018-09-01	320,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	19 POSTE	4.00	3	POBLADO	1	100	100	100.00
24026/0069/290826	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL CAMINO VIEJO / SANTIAGO YECHE BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2018-08-30	2018-09-14	41,737.84	41,737.84	0.00	41,737.84	41,737.84	0.00	01 METRO LINEAL	110.00	3	POBLADO	1	36	98	200.00
24029/0070/299832	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE EL RINCON / BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2018-08-30	2018-09-29	189,284.20	189,284.20	0.00	189,284.20	189,284.20	0.00	01 METRO LINEAL	350.00	3	POBLADO	1	60	97	100.00
24039/0071/284950	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MANVORO	ADMINISTRACION	2018-08-15	2018-09-28	140,718.29	140,718.29	0.00	140,718.29	140,718.29	0.00	01 METRO LINEAL	500.00	3	POBLADO	1	100	99	100.00
24040/0072/351940	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	149 VADO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AJUN COSTADO DE CICLOPISTA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEL)	ADMINISTRACION	2018-08-20	2018-09-30	193,005.26	193,005.26	0.00	193,005.26	193,005.26	0.00	01 METRO LINEAL	185.00	3	POBLADO	1	21	100	100.00
24041/0073/290843	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / MEJE	ADMINISTRACION	2018-09-03	2018-10-30	110,246.40	110,246.40	0.00	110,246.40	110,246.40	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3	POBLADO	1	180	100	100.00






MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
 Registro de Avances Fisicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejecutada				Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ingreso	Objetividad	Mod. Ejec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Acrob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
24042/0074	15 AVS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / HUENETLA	ADMINISTRACION	2018-09-03	2018-10-30	47,233.74	47,233.74	0.00	47,233.74	47,233.74	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLAD O	1	260	100	100.00	100.00	
24043/0075	15 AVS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MANANTIALES (LAS FUENTES YACHE) / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2018-09-03	2018-10-30	81,269.14	81,269.14	0.00	81,269.14	81,269.14	0.00	01 METRO LINEAL	1.00	3 POBLAD O	1	120	100	100.00	100.00	
24044/0076	15 AVS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LA CRUZ / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2018-08-01	2018-08-31	97,733.18	97,733.18	0.00	97,733.18	97,733.18	0.00	01 METRO LINEAL	68.00	3 POBLAD O	1	20	100	100.00	100.00	
24459/0077	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE PRINCIPAL / OJO DE AGUA	CONTRATO	2018-08-01	2018-10-01	235,664.03	235,664.03	0.00	235,664.03	235,664.03	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	80	100	100.00	100.00	
24461/0078	15 AVS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO / LOS REYES	CONTRATO	2018-07-02	2018-07-31	299,964.90	299,964.90	0.00	299,964.90	299,964.90	0.00	01 METRO LINEAL	237.40	3 POBLAD O	1	113	100	100.00	100.00	
24462/0079	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE PARA LA PALMA CUARTEL CENTRO / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRATO	2018-07-01	2018-09-01	209,999.99	209,999.99	0.00	209,999.99	209,999.99	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	50	100	100.00	100.00	
24469/0080	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARTE BAJA / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2018-07-09	2018-09-06	343,216.84	343,216.84	0.00	343,216.84	343,216.84	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD O	1	60	100	100.00	100.00	
24473/0081	15 AVS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE PARA LA LOMA / SANTIAGO YECHE	CONTRATO	2018-07-16	2018-08-14	498,988.38	498,988.38	0.00	498,988.38	498,988.38	0.00	01 METRO LINEAL	384.00	3 POBLAD O	1	126	100	100.00	100.00	
24480/0082	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BANTO JUAREZ AUN COSTADO DEL AUDITORIO EJIDAL / LOS REYES	CONTRATO	2018-09-18	2018-10-06	328,999.59	328,999.59	0.00	328,999.59	328,999.59	0.00	19 POSTE	4.00	4 MUNICIPI O	1	50	100	100.00	100.00	
24482/0083	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE / MEJE	CONTRATO	2018-08-20	2018-10-18	90,692.96	90,692.96	0.00	90,692.96	90,692.96	0.00	19 POSTE	2.00	3 POBLAD O	1	48	100	100.00	100.00	
24483/0084	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2018-07-01	2018-09-01	128,931.06	128,931.06	0.00	128,931.06	128,931.06	0.00	19 POSTE	3.00	3 POBLAD O	1	35	100	100.00	100.00	
25052/0085	15 AVS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN COL. CENTRO / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2018-12-01	2018-12-22	349,942.47	349,942.47	0.00	349,942.47	349,942.47	0.00	01 METRO LINEAL	163.96	3 POBLAD O	1	90	100	100.00	100.00	
25053/0086	17 URB	URBANIZACION	B REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO AL CONVENTO Y A CALLE JERONIMOS / SANTA CLARA	CONTRATO	2018-06-04	2018-07-08	149,787.73	149,787.73	0.00	149,787.73	149,787.73	0.00	04 KILOM ETRO	1.50	3 POBLAD O	1	150	100	100.00	100.00	
25054/0087	17 URB	URBANIZACION	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO SAN JOAQUIN	CONTRATO	2018-07-02	2018-08-30	119,889.75	119,889.75	0.00	119,889.75	119,889.75	0.00	19 POSTE	1.00	3 POBLAD O	1	100	100	100.00	100.00	
25055/0088	17 URB	URBANIZACION	B REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHA / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2018-08-28	2018-08-31	99,629.79	99,629.79	0.00	99,629.79	99,629.79	0.00	04 KILOM ETRO	0.32	3 POBLAD O	1	100	100	100.00	100.00	





MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2018, AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
Reporte de Ejercicio Acumulado

Datos de la Obra y/o Acción

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Índice	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fac. In. Pro.	Fac. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances					
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Apr. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.
25066/0089	17 URB	UR	C REHABILITACION COMPLEMEN TARIOS	251 CAMINOS/ CARRETERAS	REHABILITACION DE CAMINO SACO COSECHA / SAN MARCOS COALOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2018-09-20	2018-08-25	199,739.59	199,739.59	0.00	199,739.59	0.00	0.00	04 KILOM ETRO	0.54	3	POBLAD	1	200	100	100.00
25057/0090	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CUARTEL CENTRO Y CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRATACION	2018-09-01	2018-09-20	249,858.32	249,858.32	0.00	249,858.32	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	170.00	3	POBLAD	1	80	100	100.00
25059/0091	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AUN COSTADO DE LA DELEGACION / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATACION	2018-10-20	2018-11-30	270,509.92	270,509.92	0.00	270,509.92	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3	POBLAD	1	50	100	100.00
25073/0092	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL RANCHO DE LOS LEONES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2018-09-03	2018-09-29	26,661.40	26,661.40	0.00	26,661.40	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	100.00	3	POBLAD	1	30	100	100.00
25076/0093	15 AYS	AP AGUA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL / BARRIO SAN JACINTO	ADMINISTRACION	2018-10-20	2018-11-02	59,997.77	59,997.77	0.00	59,997.77	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	1,008.00	3	POBLAD	1	61	100	100.00
25077/0094	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DE NIÑOS 2DA ETAPA / BARRIO DE ENGASEME	CONTRATACION	2018-08-20	2018-10-10	937,447.84	937,447.84	0.00	937,447.84	0.00	0.00	18 POSTE	5.00	3	POBLAD	1	60	100	100.00
25081/0095	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL / SANTIAAGO YECHE	ADMINISTRACION	2018-11-01	2018-11-30	100,003.60	100,003.60	0.00	100,003.60	0.00	0.00	19 POSTE	4.00	3	POBLAD	1	42	100	100.00
25082/0096	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE / TIACAQUE	CONTRATACION	2018-10-08	2018-11-07	99,999.11	99,999.11	0.00	99,999.11	0.00	0.00	19 POSTE	2.00	3	POBLAD	1	60	100	100.00
25083/0097	17 URB	UR	B AMPLIACION COMPLEMEN TARIOS	011 ALUMBRADO PUBLICO	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA / BARRIO SAN JACINTO	CONTRATACION	2018-10-21	2018-11-29	99,994.96	99,994.96	0.00	99,994.96	0.00	0.00	19 POSTE	2.00	3	POBLAD	1	35	100	100.00
25084/0098	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PARALE SHORA A PARALE SHARES / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATACION	2018-10-15	2018-11-13	559,985.09	559,985.09	0.00	559,985.09	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00	3	POBLAD	1	78	100	100.00
25085/0099	17 URB	UR	S INSTALACION COMPLEMEN TARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN SISTEMA DE AGUA POTABLE / BARRIO BOYECCHA	CONTRATACION	2018-10-17	2018-11-15	855,995.79	615,824.25	240,171.54	855,995.79	240,171.54	0.00	17 PIEZA	1.00	3	POBLAD	1	500	100	100.00
25086/0100	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE CUARTEL CENTRO / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRATACION	2018-09-01	2018-10-10	116,352.79	116,352.79	0.00	116,352.79	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	90.00	3	POBLAD	1	35	100	100.00
25087/0101	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE / REYES LOS	CONTRATACION	2018-11-12	2018-12-18	179,198.47	179,198.47	0.00	179,198.47	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	150.00	3	POBLAD	1	106	100	100.00
25088/0102	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN PARALE NENE / SANTA MARIA CITEENDEJE	CONTRATACION	2018-10-29	2018-11-27	289,187.98	289,187.98	0.00	289,187.98	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	250.00	3	POBLAD	1	160	100	100.00
25093/0103	15 AYS	UR	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA GASOLINERA / SAN MIGUEL TENOCHTITLÁN	ADMINISTRACION	2018-09-01	2018-11-15	111,278.64	111,278.64	0.00	111,278.64	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	30.00	3	POBLAD	1	50	100	100.00
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 103									27,160,860.54	26,920,889.00	240,171.54	27,160,860.54	26,920,889.00	240,171.54					10204			



GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 26,920,689.00 REINTEGRO: \$ 0.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros (Cifras en Pesos) MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Año de Ejercicio 2018. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inicio	Obralocalidad	Mod. Ejec.	Fac. In. Pro.		Total	Inversión Aprobada		Inversión Ejecida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fac In Real	Fac Ter Real		R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprub Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
Complementarios: 68							Directa: 35													

*[Signature]*  
 LIC. IVAN DE JESUS  
 ESQUER CRUZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016 - 2018

*[Signature]*  
 M. En C. y C.P. MIREVA  
 MONROY MONROY  
 TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018

*[Signature]*  
 ARQ. FELICIANO DÍAZ  
 RODRIGUEZ  
 DIRECTOR DE OBRAS  
 PÚBLICAS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018

*[Signature]*  
 LIC. EDUARDO GARREOLA  
 GARCÍA  
 CONTRALOR INTERNO  
 MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018

