



"2022. Año del Quincentenario de Toluca, Capital del Estado de México"

Ciudad de Jocotitlán, Estado de México a 12 de Octubre de 2022.

Oficio Número: TMJ/277/2022

LIC. YAZMIN ENRIQUEZ VAZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARIA DE PLANEACION
Y PRESUPUESTO
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 240 primer párrafo del Código Financiero del Estado de México y Municipios, se remite el avance físico-financiero de las obras o acciones que se ejecuten con recursos de origen federal, bajo los mecanismos y periodos establecidos, en términos de la normatividad aplicable, así mismo se envía el **Reporte de Avance del Ramo 33** en sus vertientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (F.I.S.M.D.F.) con movimientos, así como del programa Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF) con movimientos, correspondiente al mes de **SEPTIEMBRE de 2022.**

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.



ATENTAMENTE

MARIA TERESA GARDUÑO MANJARREZ
TESORERA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
c.c.p. archivo
JOCOTITLÁN, MEX.
2022-2024
MTGM/dns



13 OCT 2022

UNIDAD DE NORMATIVIDAD



PUEBLO
CON
ENCANTO
JOCOTITLÁN

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							2022-04-26	2022-07-29		Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Real	Cantidad	U. Personas
55295/000130484	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA 2 DE MARZO C.C.T. 15EPR24322 EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAYORO ASENTAMIENTO MAYORO / MAYORO	CONTRATO	1,182,531.00	1,180,774.76	0.00	1,180,774.76	0.00	02 METRO CUADRO	447.87	5 ALUMNO	280	99	99.85	
55314/00021027	17 URB	URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES DIECISEIS DE SEPTIEMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	CONTRATO	1,819,401.10	1,819,401.10	0.00	1,819,401.10	0.00	02 METRO CUADRO	1,570.30	3 POBLADO	1	100	100.00	
55321/000326935	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	439,831.65	355,062.93	0.00	355,062.93	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	81	80.73	
55326/000463466	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	463,189.08	384,585.45	0.00	384,585.45	0.00	17 PIEZA	1.00	4 MUNICIPIO	1	83	85.03	
55327/000529100	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	211 PRIMARIA (AULAS)	CONTRATO	1,450,000.00	1,153,287.48	0.00	1,153,287.48	0.00	02 METRO CUADRO	73.00	5 ALUMNO	1	80	79.53	
55334/000661052	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA FILIBERTO GOMEZ C.C.T. 15DPR1390R EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	1,184,476.63	1,182,754.87	0.00	1,182,754.87	0.00	02 METRO CUADRO	493.00	5 ALUMNO	1	99	99.85	
55343/000780797	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	285,767.16	262,402.90	0.00	262,402.90	0.00	17 PIEZA	2.00	3 POBLADO	1	92	91.82	
55346/000833640	18 VIV	17 ELECTRICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	CONTRATO	442,487.80	413,228.48	0.00	413,228.48	0.00	17 PIEZA	7.80	3 POBLADO	1	93	93.39	

ESTADO DE CUENTA DE EJERCICIO
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE INFORMATICA
13 OCT 2022

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incidio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	U. Personas	Fin.
56353/0009/60964	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN PEDRO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO DE GUADALUPE ASENTAMIENTO GUADALUPE /BARRIO DE GUADALUPE	CONTRATO	2022-05-23	2022-06-23	465,000.00	465,000.00	0.00	427,955.07	427,955.07	0.00	17 PIEZA	3 POBLADO	65	92	92.03	
55698/0010/56901	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	B AMPLIACION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ CGT 15EPRI557A EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD OJO DE AGUA / OJO DE AGUA	CONTRATO	2022-04-26	2022-07-25	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	1,135,157.96	1,135,157.96	0.00	02 METRO CUADRO	5 ALUMNO	180	99	100.00	100.00	
55718/0012/1264	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE PRIMERO DE MAYO Y VEINTE DE NOVIEMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-06-30	475,831.72	475,831.72	0.00	475,831.72	475,831.72	0.00	65 KILOMETRO CUADRO	3 POBLADO	150	100	100.00	100.00
55729/0013/26928	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE BARRIO CHIMEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-07-15	358,319.09	358,319.09	0.00	358,319.09	358,319.09	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	180	100	100.00	100.00
55732/0014/26930	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN EL CRISTO ASENTAMIENTO SAN JUAN EL CRISTO / COL. SAN JUAN, BARRIO EL CRISTO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	260,660.61	260,660.61	0.00	260,660.61	260,660.61	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	170	100	100.00	100.00
55737/0016/32845	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL ZAPOTE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-07-15	490,198.34	490,198.34	0.00	490,198.34	490,198.34	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	160	100	100.00	100.00
55740/0017/21764	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD TIACAQUE ASENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-04-18	2022-05-20	99,970.00	99,970.00	0.00	95,471.02	95,471.02	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	40	80	95.50	95.50
55743/0018/21765	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ANDADOR RUMBO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD 15 DE AGOSTO ASENTAMIENTO 15 DE AGOSTO / BARRIO QUINCE DE AGOSTO	ADMINISTRACION	2022-04-20	2022-06-22	196,646.00	196,646.00	0.00	54,934.58	54,934.58	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	50	28	27.94	27.94
55744/0019/21769	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO SAN JOAQUIN ASENTAMIENTO SAN JOAQUIN / BARRIO SAN JOAQUIN	ADMINISTRACION	2022-04-28	2022-05-31	276,641.16	276,641.16	0.00	276,641.16	276,641.16	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	80	100	100.00	100.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMUNICACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Otra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Real	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
				Inciso	Obra/Localidad				R. del Fondo	Total			R. del Fondo	Total	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Medida	U. Personas	Fis.
55745/002021776	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLES LAS JACARANDAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SIFFARI / ASENTAMIENTO SIFFARI / SIFFARI	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	196,329.80	196,329.80	0.00	196,329.80	196,329.80	0.00	02 METRO CUADRO	546.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
55748/002021778	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE PARA EL MOLINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE / ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-06	53,789.95	53,789.95	0.00	53,789.95	53,789.95	0.00	02 METRO CUADRO	138.00	3 POBLADO	1	120	100	100.00
55764/002033592	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA / ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-19	2022-05-06	149,190.00	149,190.00	0.00	135,248.77	135,248.77	0.00	01 METRO LINEAL	1,440.00	3 POBLADO	1	103	91	90.65
55761/002032679	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 12 DE DICIEMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-07-30	211,970.12	211,970.12	0.00	211,970.12	211,970.12	0.00	01 METRO LINEAL	400.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
55764/002091086	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CONCEPCION CARO ASENTAMIENTO CONCEPCION CARO / CONCEPCION CARO	ADMINISTRACION	2022-06-06	2022-08-19	82,810.00	82,810.00	0.00	81,403.03	81,403.03	0.00	01 METRO LINEAL	170.00	3 POBLADO	1	90	98	98.30
55783/002091037	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MARCOS COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN MARCOS COAJOMULCO / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-08-31	183,580.00	183,580.00	0.00	180,302.52	180,302.52	0.00	02 METRO CUADRO	394.40	3 POBLADO	1	80	98	96.21
55797/002026931	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE TAPELLY CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE ASENTAMIENTO SANTA MARIA CITENDEJE / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-08-31	955,403.59	955,403.59	0.00	955,403.59	955,403.59	0.00	02 METRO CUADRO	1,893.00	3 POBLADO	1	150	100	100.00
55799/002026938	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO BUENAVISTA ASENTAMIENTO BUENAVISTA / BARRIO DE BUENAVISTA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-11	202,214.60	202,214.60	0.00	202,214.60	202,214.60	0.00	02 METRO CUADRO	525.00	3 POBLADO	1	54	100	100.00
55801/002021777	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LAS ANIMAS DE VILLEJE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN JOSE DE VILLEJE / ASENTAMIENTO SAN JOSE DE VILLEJE / ANIMAS VILLEJE, LAS	ADMINISTRACION	2022-04-25	2022-06-24	187,024.83	187,024.83	0.00	187,024.83	187,024.83	0.00	02 METRO CUADRO	400.00	3 POBLADO	1	220	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,798.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Instituto	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Métros Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
55804/0030/21770	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CASA BLANCA / ASENTAMIENTO CASA BLANCA / CASA BLANCA	ADMINISTRACION	2022-05-20	2022-07-04	172,442.23	172,442.23	0.00	172,442.23	172,442.23	0.00	02 METRO CUADRO	384.00	1	36	100.00	100.00
55806/0031/30168	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ENGUINDO SAN ISIDRO ASENTAMIENTO ENGUINDO SAN ISIDRO / BARRIO DE ENGUINDO (LOS TECOLOTES)	ADMINISTRACION	2022-05-24	2022-07-25	296,520.00	296,520.00	0.00	247,033.94	247,033.94	0.00	02 METRO CUADRO	800.00	1	80	83.31	83.31
55807/0032/30480	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA MANGA / ASENTAMIENTO LA MANGA / BARRIO LA MANGA	ADMINISTRACION	2022-05-04	2022-06-28	212,850.00	212,850.00	0.00	211,474.80	211,474.80	0.00	02 METRO CUADRO	455.00	1	150	99	99
55824/0033/22486	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE GERCA PERIMETRAL EN CANCHA DE BASQUET BOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO SANTA CLARA ASENTAMIENTO SANTA CLARA / SANTA CLARA	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-22	204,957.07	204,957.07	0.00	204,957.07	204,957.07	0.00	01 METRO LINEAL	84.00	1	75	100	100.00
55828/0034/32407	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL HUERTO / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-05-09	2022-06-10	187,019.84	187,019.84	0.00	187,019.84	187,019.84	0.00	02 METRO CUADRO	372.00	1	200	100	100.00
55832/0035/21779	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE BICENTENARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL RUSO ASENTAMIENTO EL RUSO / EL RUSO	ADMINISTRACION	2022-04-27	2022-06-30	220,409.80	220,409.80	0.00	220,409.80	220,409.80	0.00	02 METRO CUADRO	570.00	1	420	100	100.00
55833/0036/30479	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD ZACUALPAN ASENTAMIENTO ZACUALPAN / ZACUALPAN	ADMINISTRACION	2022-05-03	2022-07-29	180,000.00	180,000.00	0.00	176,211.85	176,211.85	0.00	02 METRO CUADRO	390.00	1	120	98	97.90
55834/0037/21767	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE BOYECHA ASENTAMIENTO BOYECHA / BARRIO BOYECHA	ADMINISTRACION	2022-05-17	2022-06-20	153,252.37	153,252.37	0.00	153,252.37	153,252.37	0.00	02 METRO CUADRO	315.00	1	50	100	100.00
55835/0038/33988	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SIN NOMBRE PARAJE CHOYA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUEMETLA ASENTAMIENTO HUEMETLA / HUEMETLA	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-10	479,856.88	479,856.88	0.00	479,856.88	479,856.88	0.00	02 METRO CUADRO	931.00	1	150	100	100.00
55837/0039/21768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEM TARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MEJE ASENTAMIENTO MEJE / MEJE	ADMINISTRACION	2022-05-23	2022-06-30	389,048.40	389,048.40	0.00	389,048.40	389,048.40	0.00	02 METRO CUADRO	633.00	1	134	100	100.00

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	U. Medida	Metas Totales		U. Medida	Beneficiarios		Avances		
				Inicio	Obra/Localidad				R. del Fondo	Intereses B.			R. del Fondo	Intereses B.			U. Medida	U. Medida		U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida	U. Medida
55838/0040/21772	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE ANTONIO DEL VALLE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD TIACAQUE / ASIENTAMIENTO TIACAQUE / TIACAQUE	ADMINISTRACION	2022-06-09	2022-08-30	325,236.84	325,236.84	0.00	325,236.84	325,236.84	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	57	100.00				
55839/0041/101311	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD CHIVORO / ASIENTAMIENTO CHIVORO / BARRIO DE CHIVORO	ADMINISTRACION	2022-06-03	2022-08-04	185,890.00	185,890.00	0.00	184,177.92	184,177.92	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	120	99.07				
55849/0042/32766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-16	2022-07-30	414,384.36	414,384.36	0.00	414,384.36	414,384.36	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	80	100.00				
56105/0043/33100	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE LA CALLE ISIDRO FABELA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD MAVORO / MAVORO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-07-11	131,557.85	131,557.85	0.00	131,557.85	131,557.85	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	220	100.00				
56107/0044/35081	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL POZO BARRIO LA PRESA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE / ASIENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-31	254,084.75	254,084.75	0.00	254,084.75	254,084.75	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	100	100.00				
56112/0045/68615	15 AYS	AP AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA LOCALIDAD SAN JOSE BOQUI / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2022-06-08	2022-07-31	1,095,454.98	1,095,454.98	0.00	981,922.52	981,922.52	0.00	0.00	50 EQUIPO	3 POBLADO	1	520	90	89.64			
56115/0046/90873	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE BANQUETAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA KM. 41.6 TOLUCA PALMILLAS JILOTEPEC EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EJIDO DE LA PROVIDENCIA / EJIDO DE PROVIDENCIA	ADMINISTRACION	2022-06-20	2022-07-22	101,860.00	101,860.00	0.00	99,693.50	99,693.50	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	98	97.85			
56117/0047/61000	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA LOMA DE ENDARE / ASIENTAMIENTO LA LOMA DE ENDARE / BARRIO DE LA LOMA DE ENDARE	ADMINISTRACION	2022-06-10	2022-08-20	529,083.13	529,083.13	0.00	529,083.13	529,083.13	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	100.00				
56803/0048/21766	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO LA SOLEDAD / ASIENTAMIENTO LA SOLEDAD / BARRIO LA SOLEDAD	ADMINISTRACION	2022-07-04	2022-08-30	185,400.00	185,400.00	0.00	123,803.29	123,803.29	0.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	50	87	66.76			

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros


MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Iniciado	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Int. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas
56879/004921773	15 URB	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARRIAGA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTIAGO YECHE ASENTAMIENTO SANTIAGO YECHE / SANTIAGO YECHE	ADMINISTRACION	2022-07-18	2022-09-30	223,710.00	223,710.00	0.00	56,162.96	56,162.96	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	100	25	25.11
56887/005028934	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLE JUAN ALLENDE COLONIA CENTRO CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN MIGUEL TENOCHTITLAN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL TENOCHTITLAN / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	ADMINISTRACION	2022-07-08	2022-08-31	523,578.50	523,578.50	0.00	323,883.81	323,883.81	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	165	61	61.86
56889/005128536	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-06-24	196,250.00	196,250.00	0.00	171,039.82	171,039.82	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	80	87	87.16
56956/0052119231	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL BANCO DE MATERIALES PARAJE LA LOMITA EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO ASENTAMIENTO EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-06-08	2022-07-08	194,700.00	194,700.00	0.00	193,319.80	193,319.80	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	100	99	98.29
56981/0053119250	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A LA ESCUELA DE COMAFE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE TULA ASENTAMIENTO TULA / BARRIO DE TULA	ADMINISTRACION	2022-06-08	2022-07-08	161,584.84	161,584.84	0.00	161,584.84	161,584.84	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	80	100	100.00
56986/0054119277	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LOS REYES / ASENTAMIENTO LOS REYES / LOS REYES	ADMINISTRACION	2022-07-02	2022-08-31	201,675.65	201,675.65	0.00	201,675.65	201,675.65	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	80	100	100.00
57003/0055119302	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA VENTA YECHE ASENTAMIENTO LA VENTA YECHE / BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	112,725.00	112,725.00	0.00	92,743.31	92,743.31	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	60	88	82.28
57006/0056119310	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	168 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SIN NOMBRE PRINCIPAL EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SAN DIMAS ASENTAMIENTO SAN DIMAS / LOS REYES	ADMINISTRACION	2022-07-05	2022-08-19	111,050.00	111,050.00	0.00	104,563.72	104,563.72	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	50	50	94.16
57007/0057121479	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA ENDARE ASENTAMIENTO SANTA MARIA ENDARE / SANTA MARIA ENDARE	ADMINISTRACION	2022-07-09	2022-08-11	570,210.00	570,210.00	0.00	471,729.09	471,729.09	0.00	02 METRO CUADRAD	3 POBLADO	1	120	82	82.72

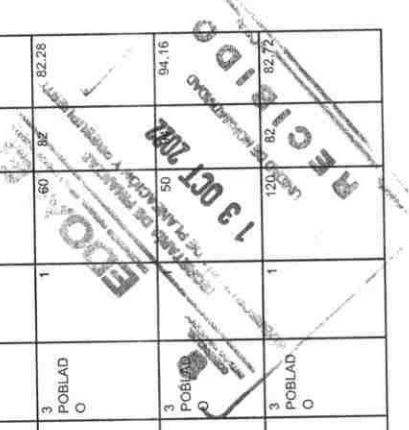



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obrera/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Real	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis.
57018/0058/121614	15 AYS	AP AGUA POTABLE	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-07-06	2022-08-10	111,975.00	111,975.00	0.00	100,006.91	100,006.91	0.00	01 METRO LINEAL	500.00	3 POBLADO	1	100	89.31	89.31
57021/0059/131768	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	052 MUROS DE CONTENCIÓN	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL NO 365 CCT 15EBH0016P EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-16	2022-08-07	95,624.83	95,624.83	0.00	95,624.83	95,624.83	0.00	02 METRO CUADRO	146.00	3 POBLADO	1	90	100.00	100.00
57023/0060/131903	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO AL DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2022-07-25	2022-09-30	268,784.94	268,784.94	0.00	268,784.94	268,784.94	0.00	02 METRO CUADRO	600.00	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00
57550/0061/21781	15 AYS	AP AGUA POTABLE	I EQUIPAMIENTO DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA / LA PROVIDENCIA, LA	ADMINISTRACION	2022-07-13	2022-07-29	89,454.35	89,454.35	0.00	89,454.35	89,454.35	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	150	100.00	100.00
57567/0062/21782	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	201 POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD HUENETLA / HUENETLA	ADMINISTRACION	2022-04-23	2022-05-20	90,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00
57613/0063/29097	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD EL LINDERO / BARRIO EL LINDERO	ADMINISTRACION	2022-05-02	2022-05-31	111,202.00	111,202.00	0.00	111,202.00	111,202.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	200	100.00	100.00
57620/0064/29099	17 URB	UR URBANIZACION	S INSTALACION COMPLEMENTARIOS	279 ELECTRIFICACION DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS FUENTES YECHE / BARRIO DE LAS FUENTES	ADMINISTRACION	2022-06-13	2022-07-28	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17 PIEZA	1.00	3 POBLADO	1	100	100.00	100.00
57634/0065/33527	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	C REHABILITACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA LARA C.C.T. 15EJN3361M EN JOCOTITLAN LOCALIDAD LAS ANIMAS VILLEJE / BARRIO DE LAS ANIMAS VILLEJE / LAS ANIMAS VILLAJE	CONTRATO	2022-05-25	2022-08-30	486,892.00	486,892.00	0.00	458,552.59	458,552.59	0.00	01 METRO LINEAL	23.86	3 POBLADO	1	60	85.49	85.49
57641/0066/35647	18 VIV	17 ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRIFICACION	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL LINDERO EN JOCOTITLAN LOCALIDAD BARRIO DE LA LUZ / ASENTAMIENTO LA LUZ / BARRIO DE LA LUZ	CONTRATO	2022-05-12	2022-06-30	479,946.91	479,946.91	0.00	410,318.71	410,318.71	0.00	17 PIEZA	4.00	3 POBLADO	1	60	85	85.49

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Registro de Avances Físicos y Financieros (Cifras en Pesos)
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 35,421,788.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obral/Localidad	Mod. Ejec. RACION	Fec. Ini. Pro.		Total	Inversión Aprobada		Intereses B.	Total	Inversión Ejercida		Intereses B.	Total	Metas Totales		U. Medida	Aprobada	Aprob Real	Beneficiarios		Avances Fis.	Avances Fin.
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real		R. del Fondo	R. del Fondo			R. del Fondo	R. del Fondo			U. Medida	U. Medida				U. Medida	Cantidad		
58382/0075/172266	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE SIN NOMBRE CON CONCRETO HIDRAULICO RUMBO A LOS LAVADEROS EN BARRIO LA PERA EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN JUAN COAJOMULCO ASENTAMIENTO SAN JUAN COAJOMULCO / SAN JUAN COAJOMULCO	ADMINISTRACION	2022-09-22	2022-09-30	97,779.84	97,779.84	0.00	97,779.84	97,779.84	0.00	97,779.84	0.00	97,779.84	02 METRO CUADRO	550.00		3 POBLADO	1	90	100	100.00	
58383/0076/176891	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE CALLE EL MANANTIAL CON CONCRETO HIDRAULICO BARRIO LLANO GRANDE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SANTIAGO CASANDEJE ASENTAMIENTO SANTIAGO CASANDEJE / SANTIAGO CASANDEJE	ADMINISTRACION	2022-09-19	2022-11-03	301,045.00	301,045.00	0.00	301,045.00	43,209.95	0.00	43,209.95	0.00	43,209.95	02 METRO CUADRO	700.00		3 POBLADO	1	120	14	14.35	
58384/0077/179980	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD LOS JAVIERES ASENTAMIENTO LOS JAVIERES / JAVIERES, LOS	ADMINISTRACION	2022-08-29	2022-09-30	135,681.23	135,681.23	0.00	135,681.23	135,681.23	0.00	135,681.23	0.00	135,681.23	01 METRO LINEAL	166.00		3 POBLADO	1	23	100	100.00	
58385/0078/194406	15 AYS	14 DRENAJE Y LETRINAS	B AMPLIACION DIRECTA	256 DRENAJE SANITARIO	EQUIPAMIENTO DE BIODIGESTOR EN VIVIENDAS A UN COSTADO DE RANCHO SECO EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD BARRIO LA TENERIA ASENTAMIENTO LA TENERIA / BARRIO LA TENERIA (TENERIA PASTEJE) BARRIO LA VENTA	ADMINISTRACION	2022-09-02	2022-09-30	287,252.50	287,252.50	0.00	287,252.50	275,706.39	0.00	275,706.39	0.00	275,706.39	01 METRO LINEAL	15.00		3 POBLADO	1	58	96	95.99	
58386/0079/202004	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	209 PREESCOLAR (BARDAS PERIMETRALES)	CONSTRUCCION DE BARRDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR JOSEFA ORTEZ DE DOMINGUEZ EN JOCOTITLÁN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHEJE ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CHEJE / SAN FRANCISCO CHEJE	ADMINISTRACION	2022-09-26	2022-11-07	367,692.00	367,692.00	0.00	367,692.00	16,649.98	0.00	16,649.98	0.00	16,649.98	02 METRO CUADRO	39.76		5 ALUMINO	1		4.53		
TOTAL														26,352,275.11	26,352,275.11	0.00	23,169,070.36	23,169,070.36	0.00	0.00	6651					

Complementarios: 48




Directa: 28

JOSÉ JESÚS CEDILLO GONZÁLEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

MARIA TERESA GARDUÑO MANABARRAZ
TESORERA MUNICIPAL

MICHELLE CAMACHO VILCHIS
DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS

MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
CONTRALORA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2022-2024

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

REINTEGRO: \$ 0.00

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 51,717,721.14

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inclso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.
52748/0001	08 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-22	2022-12-31	18,693,953.24	18,693,953.24	0.00	9,502,438.91	9,502,438.91	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	113	113	44	50.79
52870/0002	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	9,227,377.86	9,227,377.86	0.00	6,987,801.58	6,987,801.58	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	73	75.70
52871/0003	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	779,838.66	779,838.66	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	77	77.97
52872/0004	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	3,205,324.00	3,205,324.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	79	82.15
52874/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,074,713.68	3,074,713.68	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	57	61.51
52877/0006	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	L EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE UNIFORMES, EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	2,903,352.56	2,903,352.56	0.00	2,903,352.56	2,903,352.56	0.00	50 EQUIPO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	100	100.00
52878/0007	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	J PROGRAMA	285 SEGURO DE VIDA PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	220,887.77	220,887.77	0.00	220,887.77	220,887.77	0.00	80 ELEMENTO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	100	100.00
52882/0008	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SEGUROS DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-02-23	2022-12-31	300,000.00	300,000.00	0.00	199,068.61	199,068.61	0.00	34 VEHICULO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	65	66.36
52884/0009	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	965,170.51	965,170.51	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	92	96.52
52881/0010	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,569,184.12	1,569,184.12	0.00	63 MAQUINARIA	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	52	53.82
52882/0011	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	Q DEUDAS ANTERIORES	134 OBRAS Y SERVICIOS	DEUDA PUBLICA PROVEEDORES 2020 Y 2021 / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	3,835,149.71	3,835,149.71	0.00	3,835,149.71	3,835,149.71	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	100	100.00
52884/0012	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	263 CONAGUA	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-31	2022-12-31	432,000.00	432,000.00	0.00	231,508.00	231,508.00	0.00	81 PAGO	4 MUNICIPIO	1	69,264,000	52	53.82

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
 Año de Ejercicio 2022. AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Reporte de Ejercicio Acumulado

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Instituto	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Fec. Ter. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Medias Totales		Beneficiarios		Avances					
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
52895/0013	08 ADM	SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	132 CAEM	PAGO DE CAEM / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2022-03-01	2022-12-31	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	716,413.30	716,413.30	0.00	0.00	01 PAGO	12.00	4 MUNICIPIOS	1	69,264	58	59,70	
57672/0015	09 GOB	SEGURIDAD PUBLICA	SP MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	114	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	CONTRATO	2022-08-01	2022-12-31	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	669,828.80	669,828.80	0.00	0.00	50 EQUIPO	10.00	4 MUNICIPIOS	1	69,000	66	66.96	
TOTAL											51,212,721.14	51,212,721.14	0.00	34,860,680.21	34,860,680.21	0.00	0.00							1012

Complementarios: 0

Directa: 0


C. JOSÉ JESÚS CÉDILLO GONZÁLEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



MARIA TERESA BARDUÑO MANJAREZ
 TESORERA MUNICIPAL



ING. EDITH CAMACHO VILCHIS
 DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS



MTRA. ALMA ROSA SÁNCHEZ MARTÍNEZ
 CONTRALORA MUNICIPAL



13 OCT 2022
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 UNIDAD DE INFORMATICA
 TEL: (01722) 0250482
