



MUNICIPIO DE  
**JOCOTITLÁN**

**Ayuntamiento** | Jocotitlán  
Constitucional | 2016-2018



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

Ciudad de Jocotitlan, México a 13 de Julio de 2017.

OFICIO No.TMJ/0187/2017.

LIC. JOSÉ GÓMEZ MARTINEZ  
**DIRECTOR GENERAL DE INVERSIÓN**  
**PRESENTE.**

EN CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 240 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, TIENEN LA OBLIGACION DE INFORMAR EL AVANCE FISICO-FINANCIERO DE LAS OBRAS O ACCIONES QUE SE EJECUTEN CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL, BAJO LOS MECANISMOS Y PERIODOS ESTABLECIDOS, EN TERMINOS DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE ASI MISMO SE ENVIA EL REPORTE DEL SIAVAMEN DE LOS PROGRAMAS DEL RAMO 33 EN SUS VERTIENTES FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (F.I.S.M.) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017 EN CURSO, ASI COMO DEL PROGRAMA FONDOS DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF) CON MOVIMIENTOS CORRESPONDIENTE **AL MES DE JUNIO DEL 2017.**

SIN MAS POR EL MOMENTO, LE ENVIO UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEJ.  
2016-2018

**MTRA. MIREYA MONROY MONROY**  
**TESORERA MUNICIPAL**

c.c.p. LIC. EDUARDO CARREOLA GARCIA- CONTRALOR MUNICIPAL  
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ- DIRECTOR DE OBRAS  
archivo\*




Plaza Constituyentes No. 1  
Jocotitlán, México C.P. 50700  
Tel. 712 123 0191 // 712 22 8570  
ayuntamientojocotitlan16-18@hotmail.com  
[www.jocotitlan.gob.mx](http://www.jocotitlan.gob.mx)



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE JUNIO DEL 2017  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Datos de la Obra y/o Acción		Mod. Ejec.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances				
				Inciso	Obra/Localidad		Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fis.	Fin.
9028/0001	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	1,568,860.03	0.00	66 LITRO	1.00	4 MUNICIPIOS	25	62,000	37	71.31	
9030/0002	02 DEE	AC ABASTO Y COMERCIO	I EQUIPAMIENTO	006 ADQUISICION DE MATERIALES	COMBUSTIBLE / LUBRICANTES Y ADITIVOS SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	2,665,004.00	2,665,004.00	0.00	1,948,397.01	0.00	66 LITRO	1.00	4 MUNICIPIOS	40	62,000	44	73.10	
9035/0003	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	079 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE SERVICIOS PUBLICOS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	321,213.25	0.00	63 MAQUINARIA	25.00	4 MUNICIPIOS	25	100	21	32.11	
9038/0004	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	O MANTENIMIENTO	126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE SEGURIDAD PUBLICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	962,000.00	962,000.00	0.00	249,946.28	0.00	34 VEHICULO	40.00	4 MUNICIPIOS	40	62,000	24	25.99	
9039/0005	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	P NOMINA	128 NOMINA PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO)	SUELDO BASE / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	15,895,286.00	15,895,286.00	0.00	5,011,723.55	0.00	80 ELEMENTO	100.00	4 MUNICIPIOS	100	62,000	27	31.53	
9040/0006	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	3,672,089.22	3,672,089.22	0.00	1,686,959.72	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	35	45.94	
9041/0007	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	R OBLIGACIONES FINANCIERAS	133 ENERGIA ELECTRICA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	6,900,000.00	6,900,000.00	0.00	3,411,020.94	0.00	81 PAGO	1.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	39	49.44	
9042/0008	08 ADM	SF SANEAMIENTO FINANCIERO	O ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES	134 OBRA Y SERVICIOS ANTERIORES	PAGO DE PASIVOS EJERCICIOS ANTERIORES / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,183,823.78	1,183,823.78	0.00	365,387.56	0.00	81 PAGO	6.00	4 MUNICIPIOS	6	62,000	20	30.86	
9043/0009	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGUROS Y FIANZAS / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	240,000.00	240,000.00	0.00	179,121.23	0.00	50 EQUIPO	40.00	4 MUNICIPIOS	40	62,000	38	74.63	
9952/0010	08 ADM	EP EDIFICIOS DE USO COMUN	C REHABILITACION	029 EDIFICIOS PUBLICOS	REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	634,636.36	0.00	02 METRO CUADRO	1.00	4 MUNICIPIOS	600	62,000	25	63.47	
9954/0012	08 ADM	FM FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	L MAQUINARIA Y EQUIPO	113 ADQUISICION DE EQUIPO	ADQUISICION Y REPARACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	361,384.64	0.00	50 EQUIPO	15.00	4 MUNICIPIOS	90	62,000	28	36.14	
9955/0013	03 ASH	AP AGUA POTABLE	C REHABILITACION	083 SISTEMA POTABLE	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	206,000.00	206,000.00	0.00	94,634.00	0.00	15 SISTEMA	1.00	4 MUNICIPIOS	1	62,000	20	45.94	
11485/0014	09 GOB	SP SEGURIDAD PUBLICA	I EQUIPAMIENTO	121 ADQUISICION DE EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	SEGURO PARA POLICIAS / TOTAL MUNICIPAL / TOTAL MUNICIPAL	ADMINISTRACION	145,000.00	145,000.00	0.00	143,016.00	0.00	50 EQUIPO	98.00	4 MUNICIPIOS	90	62,000	98	98.63	
<b>TOTAL</b>							<b>37,069,203.00</b>	<b>37,069,203.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,976,300.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15,976,300.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15,976,300.57</b>	<b>0.00</b>	<b>15,976,300.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





GOBIERNO DEL  
ESTADO DE MÉXICO

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE JUNIO DEL 2017  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$38,079,103.88

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Incliso	Datos de la Obra y/o Acción	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
										Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	U. Personas

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL

M. EN C. Y C.P. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL

ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

LIC. EDUARDO ARREOLA GARCIA  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MEX.  
2016-2018



**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
 Registro de Avances Físicos y Financieros  
 (Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
 Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE JUNIO DE 2017  
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Cantidad
9950/0001/27546	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLA	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ENDARE ETAPA 2 DE 3 / SANTA MARIA ENDARE	CONTRATO	2017-03-20	2017-07-12	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	1,000	1	100	100.00
9951/0002/27446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	216 RED DE ALCANTARILLADO	AMPLIACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO ETAPA 1 DE 3 / SANTIAGO CASANDEJE	CONTRATO	2017-03-20	2017-06-17	749,400.00	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	03 METRO CUBICO	3 POBLADO	600	1	100	100.00
10464/0003/51446	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LA PERA / SAN FRANCISCO CHEJE	CONTRATO	2017-03-09	2017-04-28	256,065.20	256,065.20	0.00	253,136.76	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	40	1	100	98.86
10991/0004/76536	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO AL JARDIN DENINOS JOSE MARIA MORELOS Y PAVON / BARRIO DE ENGAEME	CONTRATO	2017-04-03	2017-06-10	550,000.00	427,648.11	0.00	427,648.11	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	80	1	77	77.75
10994/0005/82700	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE / LOS REYES	ADMINISTRACION	2017-06-08	2017-07-16	197,717.38	102,390.10	0.00	102,390.10	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	200	1	51	51.79
10995/0006/82856	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE SIN NOMBRE PARAJE NANGUARU CUARTEL ALDAMA / SANTA MARIA CITENDEJE	CONTRATO	2017-04-03	2017-06-01	570,000.00	376,566.48	0.00	376,566.48	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	75	1	66	66.06
10997/0007/82899	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / CONCEPCION CARO	CONTRATO	2017-04-04	2017-05-18	400,000.00	322,530.53	0.00	322,530.53	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	150	1	80	80.63
10999/0008/82911	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / SAN MIGUEL TENOCHTITLAN	CONTRATO	2017-04-13	2017-06-11	985,000.00	793,623.28	0.00	793,623.28	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1,200	1	80	80.57
11000/0009/82823	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / EL RUSO	CONTRATO	2017-04-17	2017-06-15	300,000.00	89,948.30	0.00	89,948.30	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	150	1	29	29.98
11002/0010/82791	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE / MAVORO	CONTRATO	2017-04-18	2017-06-16	370,000.00	303,879.36	0.00	303,879.36	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	200	1	81	82.13
11759/0011/106964	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLETARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRICACION, DRENAJE)	CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MAESTRO ISIDRO MARTINEZ / SAN JOSE BOQUI	CONTRATO	2017-04-11	2017-05-25	275,000.00	196,114.47	0.00	196,114.47	0.00	01 METRO LINEAL	5 ALUMNO	150	1	71	71.31
11760/0012/106749	17 URB	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	181 ELECTRICACION	AMPLIACION DE ELECTRICACION EN CALLE ERNESTO PERALTA / HUJMETLA	CONTRATO	2017-04-11	2017-06-23	290,566.52	221,553.84	0.00	221,553.84	0.00	19 POSTE	3 POBLADO	24	1	78	76.25
11761/0013/106983	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ZDA ETAPA / BARRIO EL LINDERO	CONTRATO	2017-04-18	2017-05-17	194,649.34	156,410.68	0.00	156,410.68	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	80	1	36	36.36
11762/0014/106792	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE RUMBO A JOCO / LA PROVIDENCIA	CONTRATO	2017-07-19	2017-08-14	280,000.00	83,874.46	0.00	83,874.46	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	29	1	29	29.96

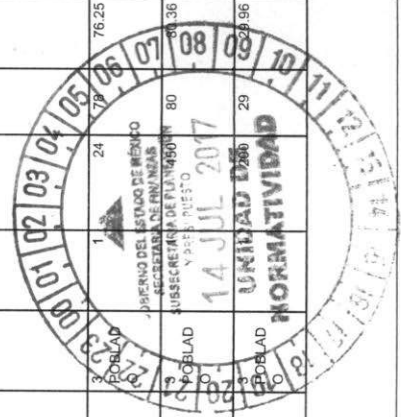

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)  
**MUNICIPIO: 049 JOCOTITLÁN / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
Año de Ejercicio 2017. AL 30 DE JUNIO DE 2017  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$24,320,374.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inicio	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Intereses B.	Inversión Ejecutada	Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
							Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo			Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.
11763/0015106761	17 URB	09 OBRAS COMPLEMENTARIAS	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	COPNSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL / SAN MARCOS COAJOMULCO (SAN MARCOS)	ADMINISTRACION	2017-06-12	2017-06-04	149,100.00	149,100.00	0.00	65,700.00	0.00	02 METRO CUADRO	3 POBLADO	1	150	44	44.06
11764/0016106757	15 AYS	11 SERVICIOS BASICOS DE LA VIVIENDA	B AMPLIACION DIRECTA	255 DRENAJE PLUVIAL	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO PRINCIPAL / SANTA MARIA CITENDEJE	ADMINISTRACION	2017-05-25	2017-06-16	111,825.00	111,825.00	0.00	97,775.00	0.00	01 METRO LINEAL	3 POBLADO	1	200	87	87.44
11766/0017112169	05 EDU	10 REZAGO EDUCATIVO	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	214 PRIMARIA (DOTACION DE SERVICIOS BASICOS: AGUA, ELECTRIFICACION, DRENAJE)	MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES / BARRIO DE LA LUZ	ADMINISTRACION	2017-04-03	2017-05-02	30,323.00	30,323.00	0.00	11,395.31	0.00	17 PIEZA	5 ALUMNO	1	80	37	37.58
<b>TOTAL</b>										<b>6,109,646.44</b>	<b>6,109,646.44</b>	<b>0.00</b>	<b>4,651,946.68</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>

  
IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2016-2018

  
M. En C. y C.P. MIREYA MONROY MONROY  
TESORERA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2016-2018

  
ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2016-2018

  
LIC. EDUARDO AREOLA GARCÍA  
CONTADOR PÚBLICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JOCOTITLÁN, MÉX.  
2016-2018

